

7.6.2024

Koulunmäen yhtenäiskoulu, yläkoulu (C-rakennus)

Projekti 318123

Viikkotiedote vko 23/2024

Lohko 1

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkötyöt
- Putkityöt
- 1.krs etuputsityöt (liikuntasali)
- 1.krs vesieristys- ja laatoitustyöt

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

-

Valmistuneet työvaiheet:

- 1.krs plaanovalmistelut
- 1.krs plaanovalu (liikuntasali)

Lohko 2

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkötyöt
- Putkityöt
- Vesikaton puutyöt
- Vesikaton peltityöt
- Talotekniikkareikien poraukset
- Ullakon IV-asennukset
- IVKH koneasennukset
- IVKH IV-asennukset
- 2.krs tasoitus- ja maalaustyöt

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- Huoltokatoksen tasoitus- ja maalaustyöt

Valmistuneet työvaiheet:

- 2.krs plaanovalmistelut
- 2.krs plaanovalu (käytävältä pieni osuus)

Lohko 3

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkötyöt
- Putkityöt
- Ullakon IV-asennukset
- 2.krs IV-asennukset
- 2.krs vesieristys- ja laatoitustyöt

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:


- 1.krs IV-asennukset

Valmistuneet työvaiheet:

-


Muuta

- Koulumäenkatu katkaistu liikenteeltä, kulkureitti jalankulkijoille reunassa
- Julkisivun puu- ja levytyöt käynnissä uimahallin puoleisella seinustalla
- Sääsuojanpeitteet ja -runko puretaan vaiheittain, lohko 1 ja 3 päädyt purettuna
- Pihalla maaurakoitsija jatkaa töitään. Sähköurakoitsijan maakaapelointi alkaa vk 24
- Kaikki väliseinät asennettu
- Kaikki lattiatasoiitteet (pilaot) valmiit

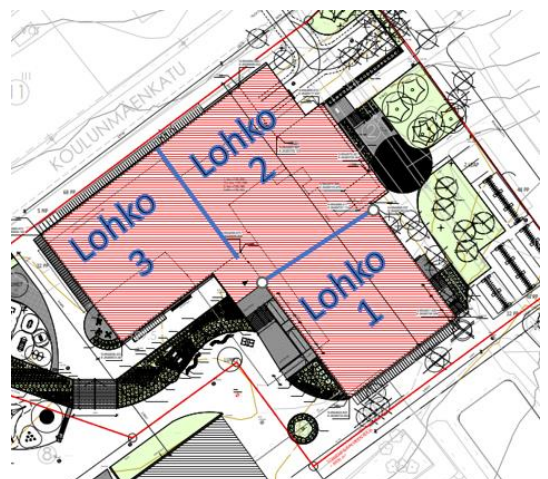

Lohko 1. 3.6.2024

Telineet kokonaan purettu lohkon
1 päädyistä.

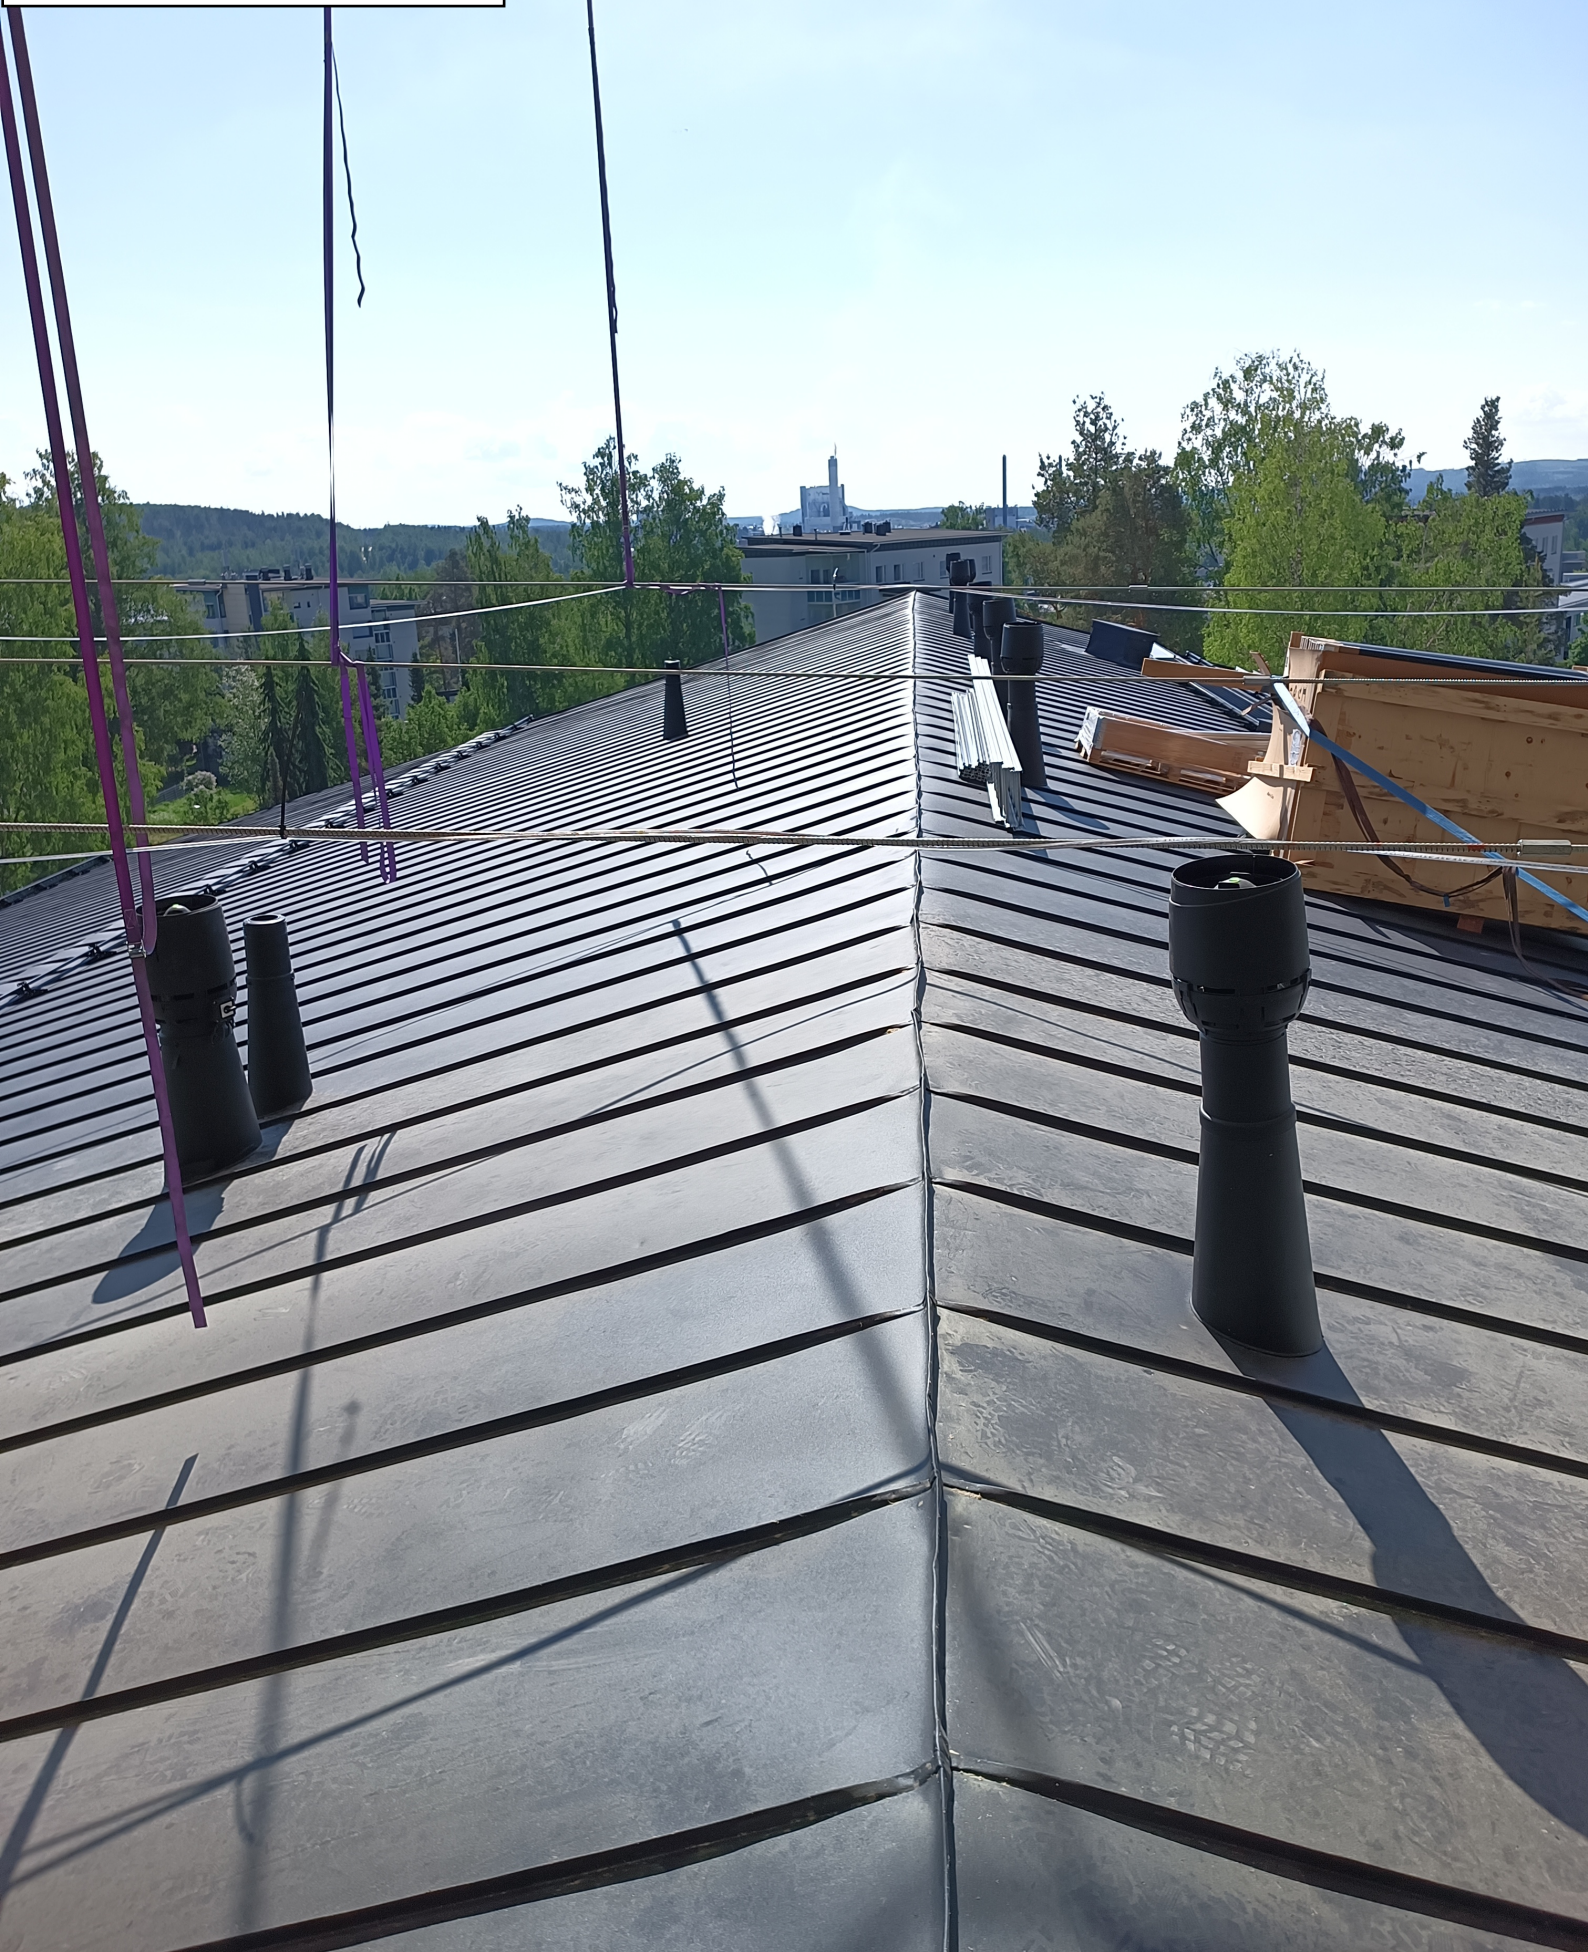

Lohko 1. 5.6.2024

Laatoitustyön jälki. Saumaus
seuraa perästä.



Lohko 1. 5.6.2024

Laatoituksen kaadot varmistetaan.



Lohko 2. 3.6.2024

Uimahallin puoleinen ulkoseinä.
Telineiden takaa pilkistää tulevan
julkisivupaneloinnin koolaukset.

