

17.1.2025

Koulunmäen yhtenäiskoulu, yläkoulu (C-rakennus)

Projekti 318123

Viikkotiedote vko 03/2025

Lohko 1

Meneillään olevat työvaiheet:

- IV-säädöt ja mittaukset
- Liikuntasalin viimeistelytyöt

Tulevat työvaiheet:

-

Valmistuneet työvaiheet:

- Loppusiivoukset
- 1.krs loput IV-asennukset

Lohko 2

Meneillään olevat työvaiheet:

- Teknisten tilojen sähkötyöt
- IV-säädöt ja mittaukset
- Loppusiivoukset
- 1.krs IV-päätelaiteasennukset
- 1.-2.krs alakattojen ummistus

Tulevat työvaiheet:

-

Valmistuneet työvaiheet:

-

Lohko 3

Meneillään olevat työvaiheet:

- IV-säädöt ja mittaukset
- Loppusiivoukset
- 1.krs ovi- ja ikkunalistoitustyöt
- 1.-2.krs alakattojen ummistus

Tulevat työvaiheet:

-

Valmistuneet työvaiheet:

-

Piha-alue

Meneillään olevat työvaiheet:

- Ylimääräisten tavaroiden poisvienti

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:


-

Valmistuneet työvaiheet:

-

Muuta

- Koko rakennuksessa käynnissä olevat työvaiheet (suluissa kokonaisvalmiusprosentti):
 - Välioviasennukset (98.5 %)
 - Varusteasennukset (98 %)
 - Kaluste- ja laiteasennukset (97 %)
 - Alakattotyöt ja seinäverhoilut (95 %)
 - Lukitus- ja heloitusasennukset (93 %)
 - Toimintakoesiivoukset (80 %)
 - Sähkö- ja putkitöiden mittaukset (~98 %)
 - IV-päätelaiteasennukset (~95 %)
 - Kaideasennukset (~95 %)
 - Kenttä- ja keskuslaiteasennukset (~90 %)
 - Maalauksen korjauskierrokset (~90 %)
 - Loppusiivoukset (~50 %)
 - IV säädöt ja mittaukset (~30 %)
- Koulunmäenkatu avataan muulle liikenteelle helmi-kuun 2025 aikana.

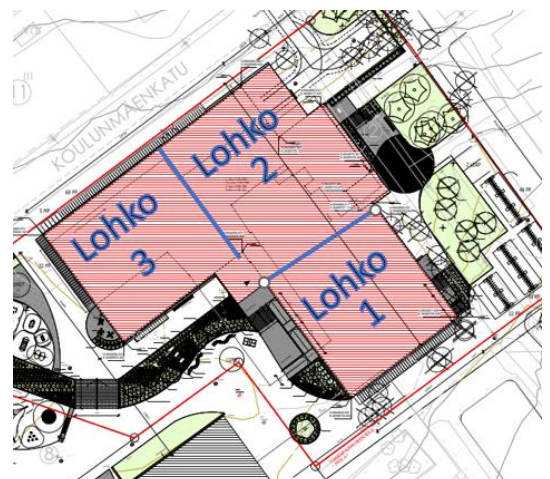

Lohko 2. 17.1.2025

Tekniset tilat, kuumakäsittelytiloissa
vielä hieman tekemistä.



Lohko 2. 17.1.2025

Musiikkitilojen yläpölyjen pyyhintä käynnissä. Perään alakaton ummistaminen.



Lohko 3. 17.1.2025

Kerroksen 2 loppusiivous käynnissä.

