

22.3.2024

Koulunmäen yhtenäiskoulu, yläkoulu (C-rakennus)

Projekti 318123

Viikkotiedote vko 12/2024

Lohko 1

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkötyöt
- Liikuntasalin ripustusrakenteet
- 1.krs tasoitus- ja maalaustyöt
- 2.krs tasoitustyöt
- VSS IV-asennukset

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- 2.krs hormien koteloinnit
- Ullakon puhallusvillat

Valmistuneet työvaiheet:

- Talotekniikkareikien poraukset

Lohko 3

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkötyöt
- Vesikaton puutyöt
- 1.krs lattiasementtiliimojen poistot
- 1.krs väliseinäsennukset

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- Talotekniikka reikien poraukset

Valmistuneet työvaiheet:

- 2.krs kevyet väliseinät

Lohko 2

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkötyöt
- Putkityöt
- Vesikaton puutyöt
- Talotekniikka reikien poraukset
- 1.krs kevyet väliseinät
- 1.krs kipsialakatot
- Ullakon IV-asennukset
- IVKH lattiapinnoitus

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:


-

Valmistuneet työvaiheet:

- 2.krs pintalaattojen hionta
- 3.krs raitisilmakammion valu
- IVKH pintalaatan hionta
- IVKH tasoitus- ja maalaustyöt

Muuta

- Koulunmäenkatu katkaistu liikenteeltä, kulkureitti jalankulkijoille reunassa
- Harjannostajaiset 26.4.

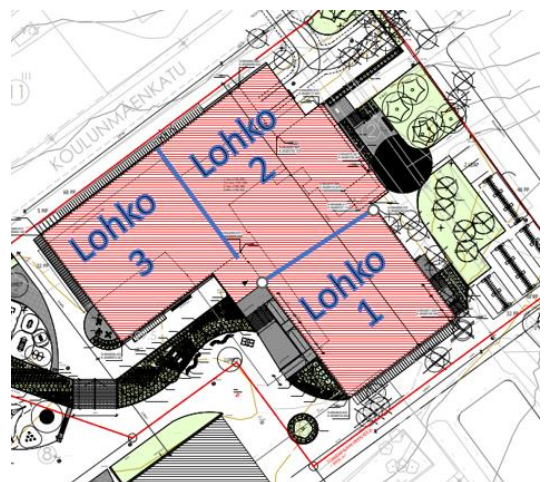

Lohko 3. 21.3.2024

Vesikaton puurakenteet etenevät hyvää tahtia, IV-asennuksia aloitettu lohkoilla 3. Vesikateurakka seuraa heti perästä.



Lohko 1. 21.3.2024

Kevyiden väliseinien tasoitus- ja maalaustyöt käynnissä. Maalaus seuraa perästä.



Lohko 3. 21.3.2024

AKO-kiviseinien asennukset
aloitettu. Perästä seuraa kevyet
väliseinät sekä tasoitus- ja
maalaustyöt.



Lohko 2. 21.3.2024

IV-konehuoneen
lattianpinnoitukset aloitettu.

