

12.4.2024

Koulunmäen yhtenäiskoulu, yläkoulu (C-rakennus)

Projekti 318123

Viikkotiedote vko 15/2024

Lohko 1

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkötyöt
- Putkityöt
- 1.krs IV-asennukset
- 1.krs kevyet väliseinät (liikuntasali)
- 2.krs tasoitus- ja maalaustyöt

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

-

Valmistuneet työvaiheet:

- Talotekniikkareikien poraukset

Lohko 3

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkötyöt
- Putkityöt
- Vesikaton puutyöt
- Vesikaton peltityöt
- Talotekniikkareikien poraukset
- Ullakon IV-asennukset
- IVKH koneasennukset
- 1.krs lattiasementtiliimojen poistot
- 1.krs kevyet väliseinät
- 1.krs kipsialakatot

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- IVKH pellitystyöt
- Vesikaton aurinkopaneelit
- 1.krs tasoitus- ja maalaustyöt
- 2.krs IV-pystynousut

Valmistuneet työvaiheet:

- 1.krs muuratut seinät

Lohko 2

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkötyöt
- Putkityöt
- Vesikaton puutyöt
- Talotekniikkareikien poraukset
- Ullakon IV-asennukset
- 1.krs kipsialakatot
- 1.krs tasoitus- ja maalaustyöt
- 2.krs kevyet väliseinät

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:


- Kattoikkunoiden asennus
- 1.krs pölynsidonta (musiikkitalat)

Valmistuneet työvaiheet:

-


Muuta

- Koulunmäenkatu katkaistu liikenteeltä, kulkureitti jalankulkijoille reunassa
- Julkisivun elementtisaumaus käynnissä, sään salliessa, lohko 1 valmis
- Harjannostajaiset 26.4.

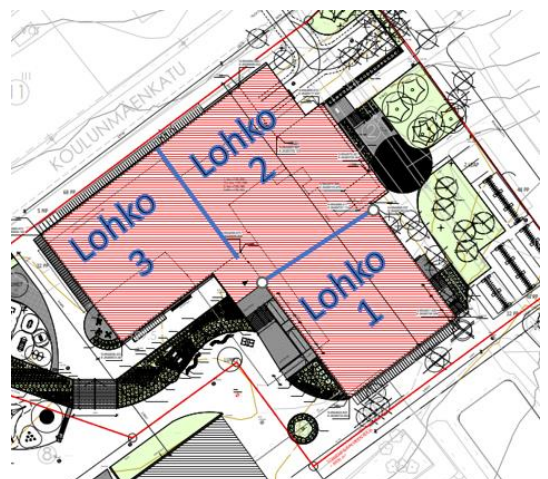

Lohko 2-3. 9.4.2024

Vesikaton puurakenteet etenevät hyvää tahtia, IV-asennuksia aloitettu lohkolla 3. Vesikate-urakka heti perässä.

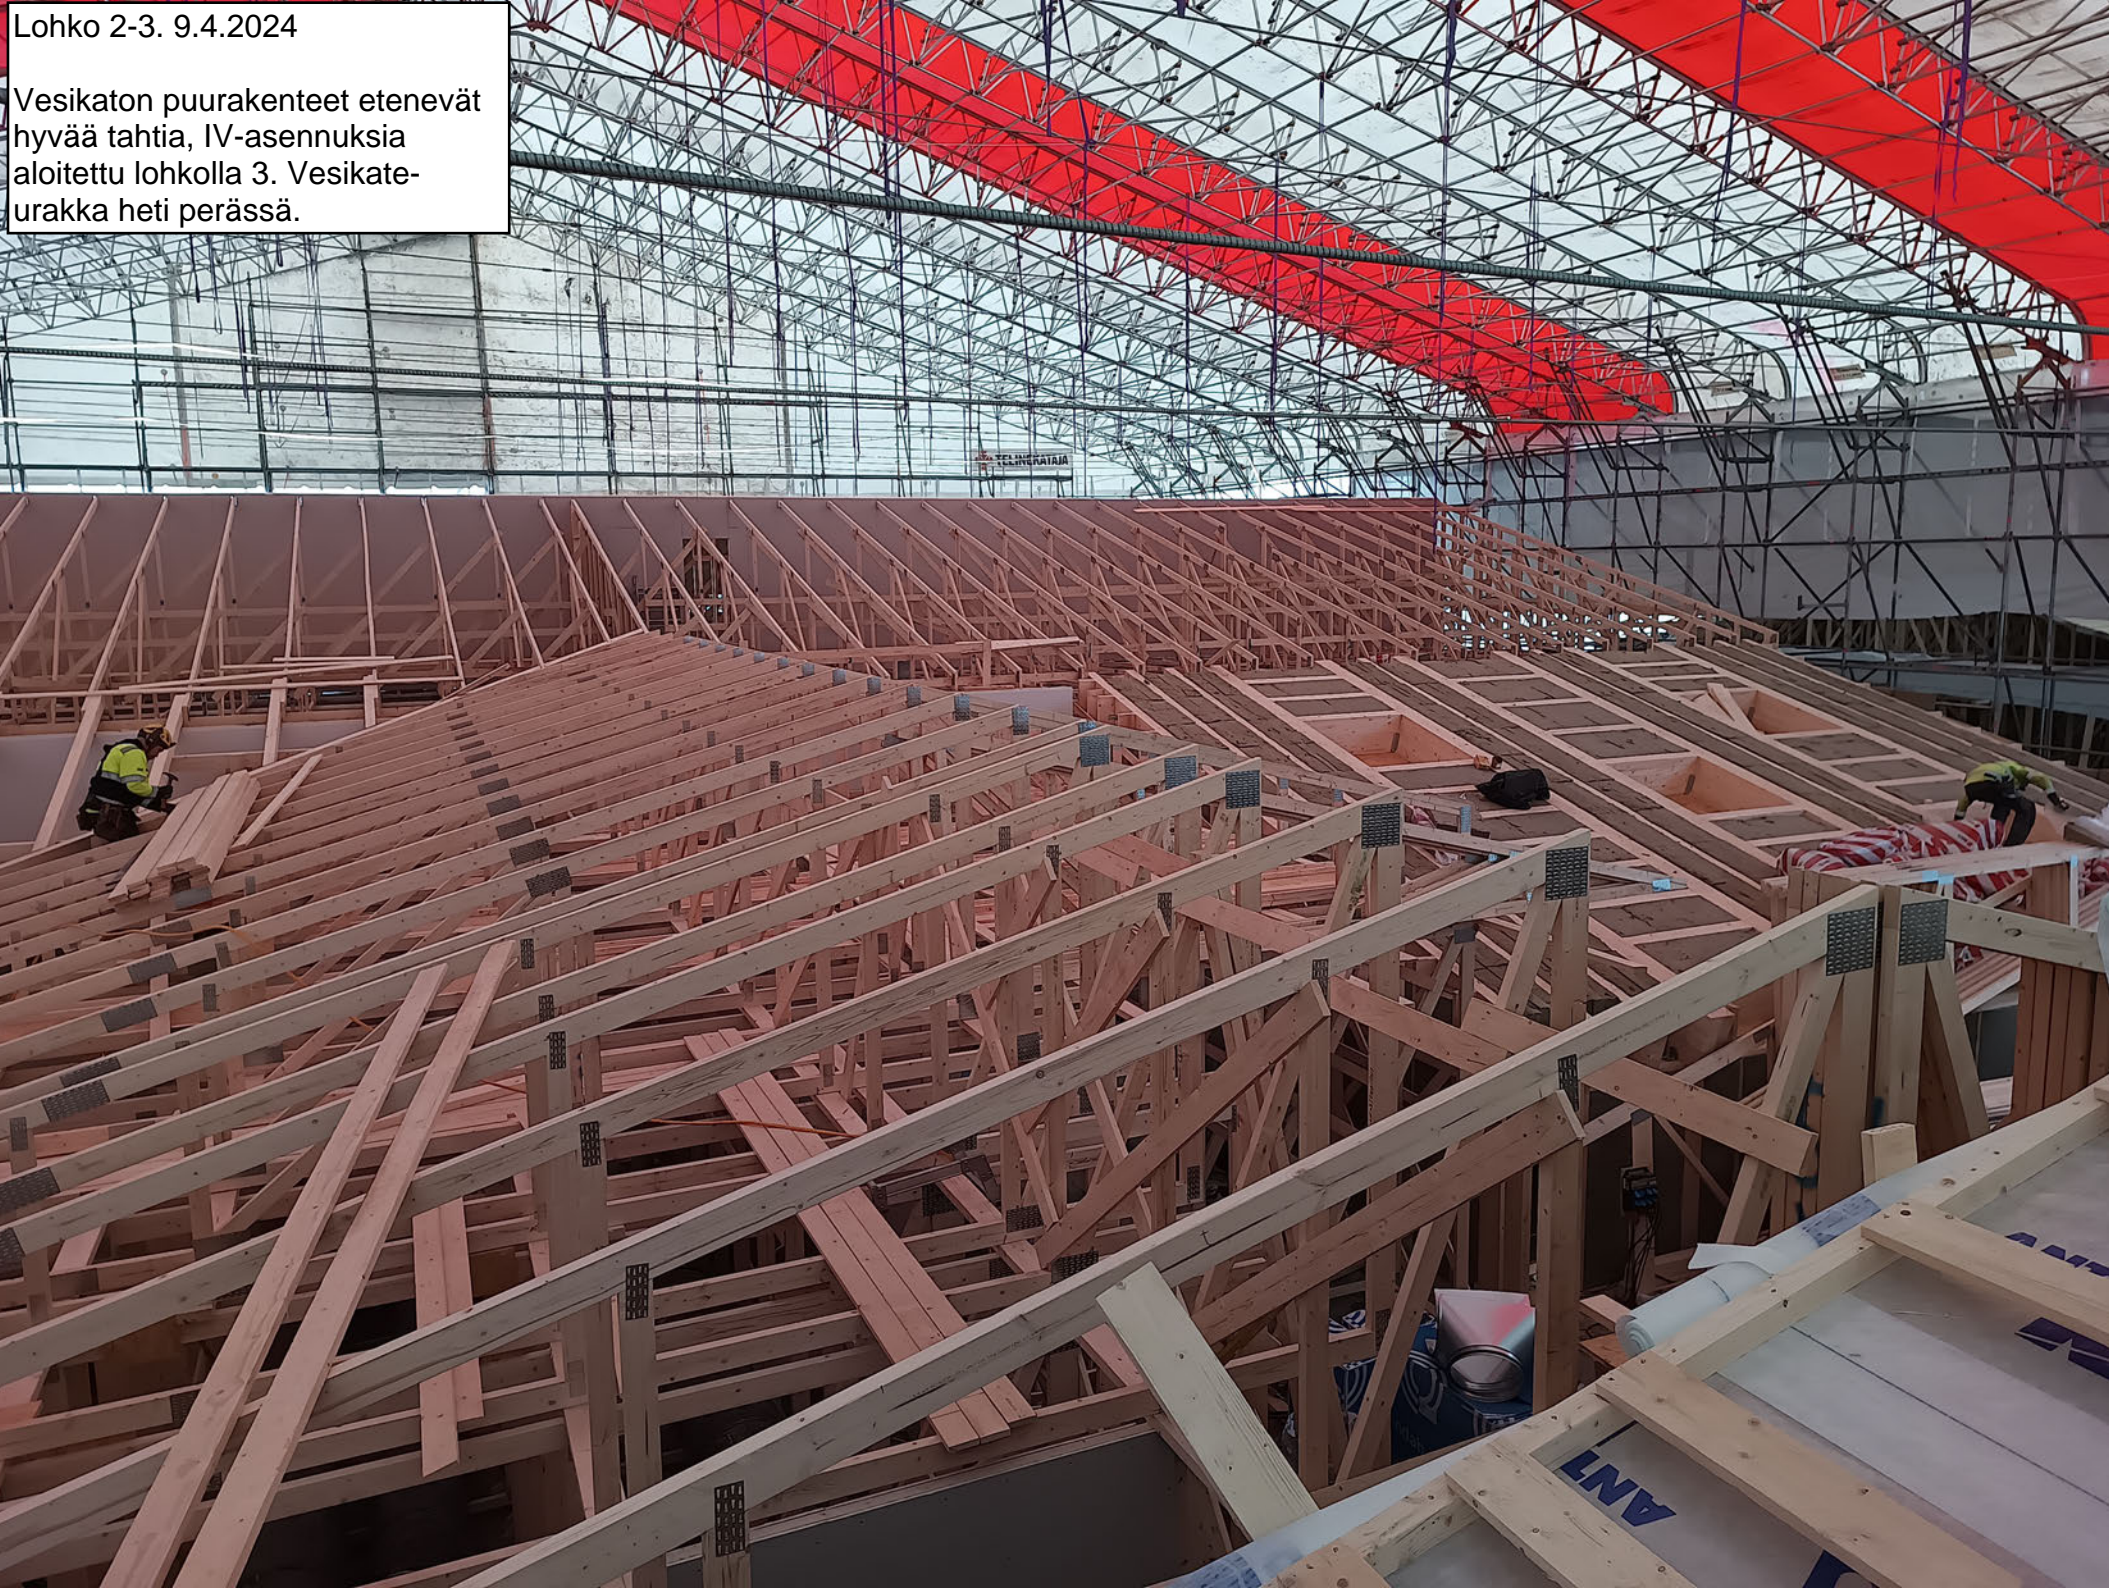

Lohko 2. 9.4.2024

Vesikaton puurakenteet etenevät
hyvää tahtia lohkolla 2.



Lohko 2. 9.4.2024

IV-konehuoneessa aloitettu ilman-
vaihtokoneiden kasaukset.



Lohko 2. 9.4.2024

Väliseinäasennukset 2.
kerroksessa etenevät hyvää
tahtia.

