

2.8.2024

Koulunmäen yhtenäiskoulu, yläkoulu (C-rakennus)

Projekti 318123

Viikkotiedote vko 31/2024

Lohko 1

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkö- ja putkityöt
- Tasoitus- ja maalaustyöt (liikuntasali)
- 1.-2.krs Kalusteasennukset

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- Valkokankaan asennus (liikuntasali)

Valmistuneet työvaiheet:

- IV-asennukset (liikuntasali)

Lohko 2

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkö- ja putkityöt
- Ullakon IV-asennukset
- IVKH IV-asennukset
- IVKH putkityöt
- IVKH ja ullakon palokatkotyöt
- Raitisilmakammion eristystyöt
- 1.krs kuivien tilojen laatoitustyöt
- 1.krs mattotyöt
- 1.krs tasoitus- ja maalaustyöt
- 1.krs vesieristys- ja laatoitustyöt
- 1.krs alakattotyöt

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- Hissin asennus
- 2.krs IV-asennukset

Valmistuneet työvaiheet:

- Vesikaton peltityöt

Lohko 3

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkö- ja putkityöt
- Ullakon IV-asennukset
- 1.krs IV-asennukset
- 1.-2.krs vesieristys- ja laatoitustyöt
- 2.krs IV-asennukset
- 2.krs vinyylilankkuasennukset

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- 2.krs Kalusteasennukset

Valmistuneet työvaiheet:

- 1.krs tasoitus- ja maalaustyöt

Piha-alue

Meneillään olevat työvaiheet:

- Piha- ja aluevarustetyöt
- Maakaapeloinnit
- Julkisivun puu- ja levytyöt (uimahallin puoleinen seinusta)
- Sääsuojelaineiden purkutyöt
- Sisääntulokatoksien puurakenteet
- Sisääntulokatoksien peltirakenteet
- 1.krs ikkunapellitykset

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:


-

Valmistuneet työvaiheet:

- Maantäytöt rakennuksen ympärillä

Muuta

- Koulumäenkadun muutoksia kevyelle liikenteelle tehty 18.–19.7. Jatkossa jalankulkuväylä kulkee Koulumäenkadun lävitse. Lisäksi vain työmaakäytössä oleva autoliikenneväylä.

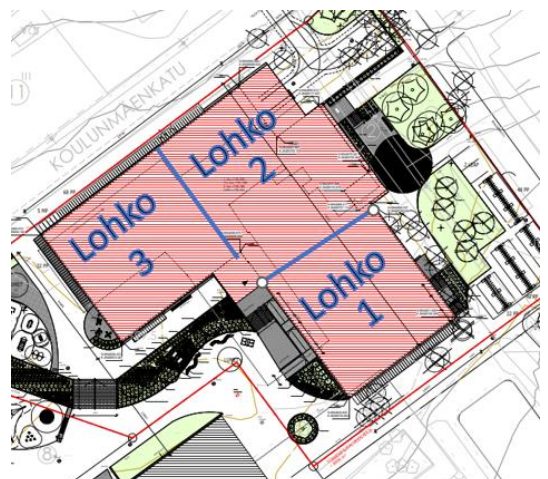

Lohko 2. 2.8.2024

Käytävän laatoitustyöt käynnissä.



Lohko 3. 2.8.2024

Mallihuone. Kalusteasennukset
tehtynä ja vinyylilankku-
asennukset aloitettu.



Piha. 2.8.2024

Pääsisääntulokatoksen puutyöt valmistuvat tällä viikolla. Peltityöt seuraavat perästä. Tukimuurien ja liuskojen asennukset aloitettu.



Liikuntasalin tasoite- ja maalaus-
työt käynnissä. Valkokangas- ja
välineasennukset seuraavat
perästä.

