

27.9.2024

Koulunmäen yhtenäiskoulu, yläkoulu (C-rakennus)

Projekti 318123

Viikkotiedote vko 39/2024

Lohko 1

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkö- ja putkityöt
- Salivarusteiden asennus (liikuntasali)
- Säteilijöiden asennus (liikuntasali)
- 1.-2.krs kaluste- ja laiteasennukset
- 1.-2.krs välioviasennukset
- 1.krs rimaseinät

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

-

Valmistuneet työvaiheet:

- 1.krs mattotyöt

Lohko 2

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkö- ja putkityöt
- Ullakon IV-asennukset
- IVKH putkityöt
- 1.krs maalaustyöt
- 1.-2.krs rimaseinät
- 1.-2.krs kuivien tilojen laatoitustyöt
- 1.-2.krs alakattotyöt
- 1.-2.krs IV-asennukset
- 1.-2.krs mattotyöt

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

-

Valmistuneet työvaiheet:

- 1.krs tasoitustyöt

Lohko 3

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkö- ja putkityöt
- 1.krs kalusteasennukset
- 1.-2.krs vinyylilankkuasennukset
- 1.-2.krs alakattotyöt
- 1.-2.krs kuivien tilojen laatoitustyöt
- 2.krs kalusteasennukset

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

-

Valmistuneet työvaiheet:

- 2.krs mattotyöt

Piha-alue

Meneillään olevat työvaiheet:

- Piha- ja aluevarustetyöt
- Katoslippojen kourut ja syöksyt (viimeistely)

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:


-

Valmistuneet työvaiheet:

-

Muuta

- Umpiteräs- ja alumiinilasiovien (ulko-ovet) asennukset jatkuvat
- Lukitus- ja heloitustyöt käynnissä sisällä ja jatkuu ulkona oviasennuksien perästä
- Koko rakennuksen varusteasennukset käynnissä
- Koko rakennukset tasoitustyöt pääasiassa tehty, pieniä maalaustöitä jäljellä
- Alumiinisten käsijohteiden asennus (ulkokierto)
- Hissi asennettu ja käyttökunnossa
- Koulunmäenkadun muutoksia kevyelle liikenteelle tehty 18.–19.7. Jatkossa jalankulkuväylä kulkee Koulunmäenkadun lävitse. Lisäksi vain työmaakäytössä oleva autoliikenneväylä.

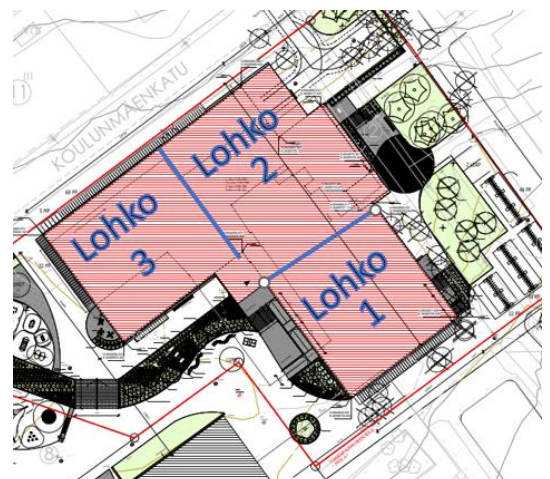

Piha. 27.9.2024

Leikkivarusteiden asemointi
pihalla aloitettu.
Reunakivien asennukset
jatkuvat.



Lohko 1. 27.9.2024

Porrashuoneisiin aloitettu
käsijohteiden asennukset.
Sisäkierto myöhemmin.



Lohko 1. 27.9.2024

Oviasennukset etenevät
1.kerroksessa. Ovien
heloitukset käynnissä.



Lohko 1. 27.9.2024

Oviasennukset etenevät
1.kerroksessa. Valaistus
toiminnassa.

