

18.10.2024

Koulunmäen yhtenäiskoulu, yläkoulu (C-rakennus)

Projekti 318123

## Viikkotiedote vko 42/2024

### Lohko 1

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkö- ja putkityöt
- 1.krs mattotyöt
- 1.krs kuivien tilojen laatoitustyöt
- 1.krs IV-asennukset (kahteen tilaan ei aiemmin päässyt)
- 1.-2.krs välioviasennukset

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- Liikuntasalin alakattotyöt (runko)
- IV-päätelaiteasennukset

Valmistuneet työvaiheet:

- VSS-tiiveysmittaukset
- Salivarusteiden asennus (liikuntasali)
- Säteilijöiden asennus (liikuntasali) jatkuvat alakattoasennuksien jälkeen

### Lohko 2

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkö- ja putkityöt
- IVKH putkityöt
- 1.krs mattotyöt
- 1.-2.krs rimaseinät
- 1.-2.krs kuivien tilojen laatoitustyöt
- 1.krs IV-asennukset
- 2.krs vinyylilankkuasennukset
- 2.krs alakattotyöt (runko)

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- 1.-2.krs välioviasennukset

Valmistuneet työvaiheet:

- Aulan ruiskutasoitekattotyöt
- 2.krs IV-asennukset

### Lohko 3

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkö- ja putkityöt
- 1.krs IV-asennukset
- 1.-2.krs välioviasennukset
- 2.krs rimaseinät

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

Valmistuneet työvaiheet:

- 1.krs kuivien tilojen laatoitustyöt

### Piha-alue

Meneillään olevat työvaiheet:

- Piha- ja aluevarustetyöt
  - Asfaltointi

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:


- 

Valmistuneet työvaiheet:

- 

### Muuta

- Umpiteräs- ja alumiinilasiovet (sisäpuoli) asennettu
- Lukitus- ja heloitustyöt käynnissä sisällä
- Varusteasennukset käynnissä
- Kaluste- ja laiteasennukset käynnissä
- Työmaa-aikaiset parakit purettu ja viety pois työmaa-alueelta
- Työmaa-aikaisten sähköjen purku
  
- Koulumäenkadun muutoksia kevyelle liikenteelle tehty 18.–19.7. Jatkossa jalankulkuväylä kulkee Koulumäenkadun lävitse. Lisäksi vain työmaakäytössä oleva autoliikenneväylä.

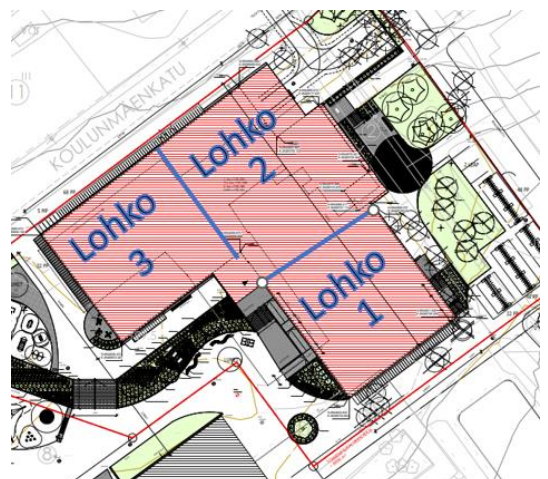

Lohko 3. 18.10.2024

Puu- ja muovioviasennukset  
käynnissä 2. kerroksessa.  
Ensi viikolla jatkuu  
alemmassa kerroksessa.



3691/8/1

2075-1


Piha. 18.10.2024

Pinnantasaukset asfalteille  
käynnissä. Pihakiveykset  
jatkuvat asfaltoinnin jälkeen.



Lohko 2. 18.10.2024

Seinäverhouselementit  
asennettu aulaan. Portaiden  
laatoitus ja puutyöt lähiaikoina.

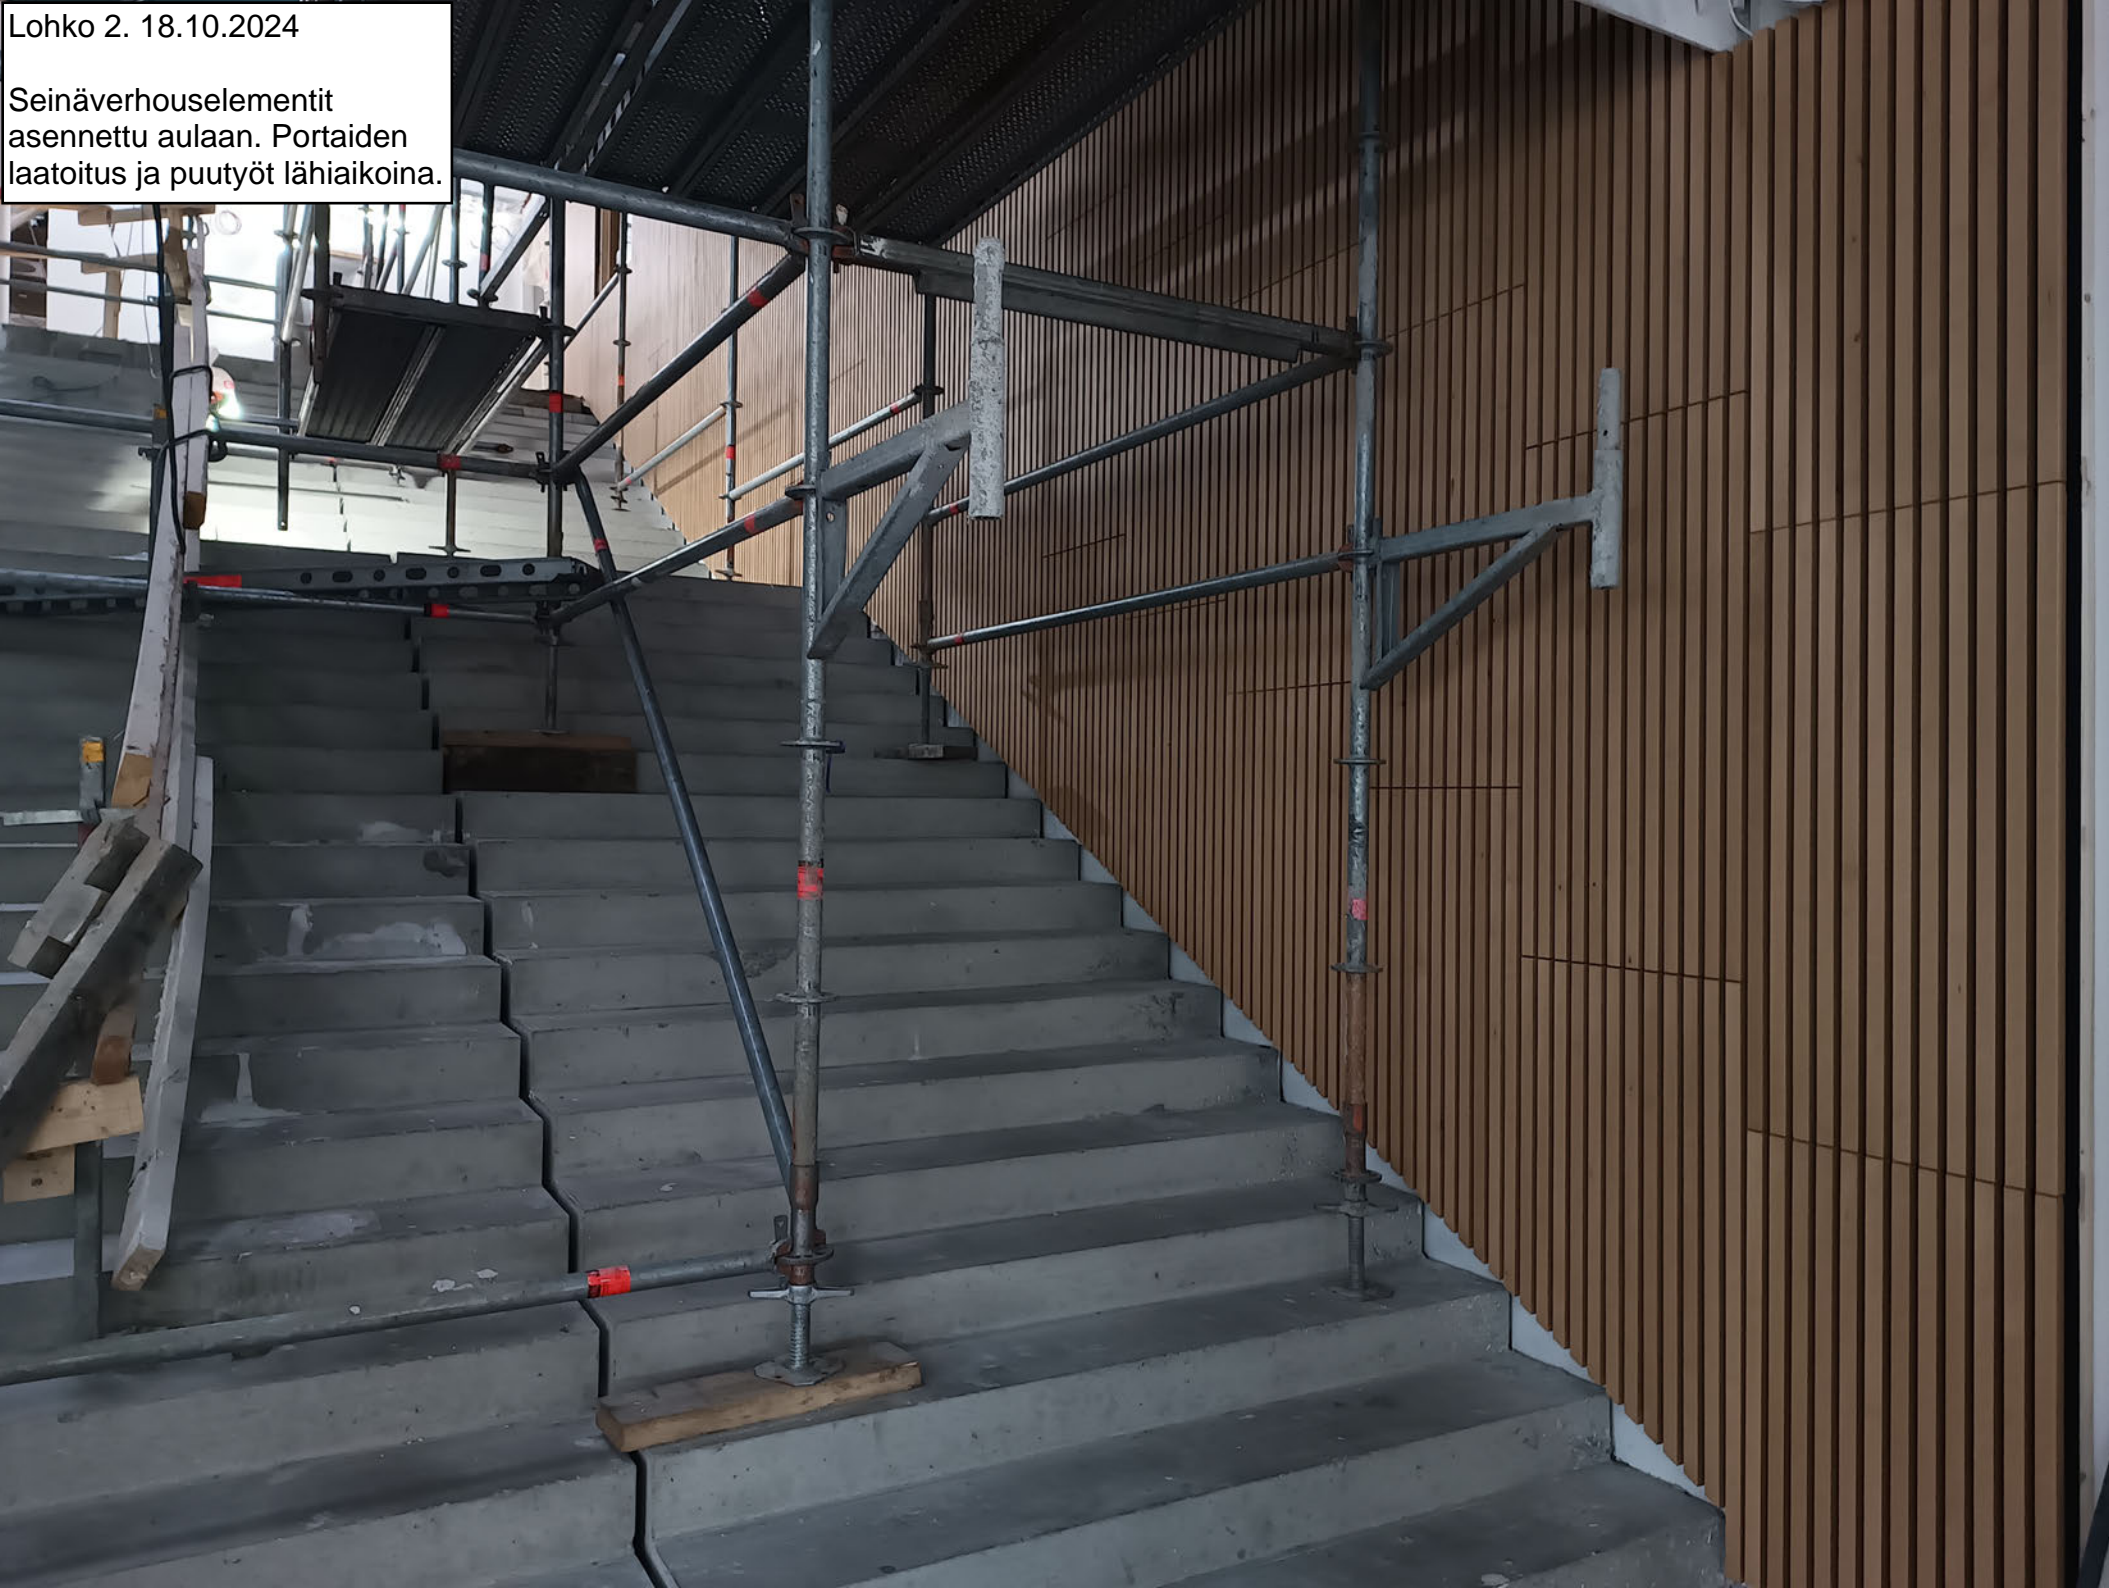

Lohko 3. 18.10.2024

Porrashuoneessa  
lattiantasoitukset käynnissä.  
Perään laatoitus.

