

25.10.2024

Koulunmäen yhtenäiskoulu, yläkoulu (C-rakennus)

Projekti 318123

Viikkotiedote vko 43/2024

Lohko 1

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkö- ja putkityöt
- 1.krs IV-asennukset (kahteen tilaan ei aiemmin päässyt)

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- Liikuntasalin alakattotyöt (runko)
- 2.krs IV-päätelaiteasennukset

Valmistuneet työvaiheet:

- 1.krs mattotyöt
- 1.krs kuivien tilojen laatoitustyöt (aula keskeytynyt)
- 1.-3.krs porraslaatat

Lohko 2

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkö- ja putkityöt
- IVKH putkityöt
- 1.-2.krs rimaseinät
- 2.krs alakattotyöt (runko)
- Korkean aulan telinetyöt

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

-

Valmistuneet työvaiheet:

- 1.krs mattotyöt
- 2.krs vinyylilankkuasennukset
- 1.-2.krs kuivien tilojen laatoitustyöt
- 1.-2.krs porraslaatat

Lohko 3

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkö- ja putkityöt
- 1.krs IV-asennukset
- 2.krs rimaseinät

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

-

Valmistuneet työvaiheet:

- 1.krs eteisen ritiläkatto
- 1.-2.krs porraslaatat

Piha-alue

Meneillään olevat työvaiheet:

- Piha- ja aluevarustetyöt

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:


-

Valmistuneet työvaiheet:

- Asfaltointi

Muuta

- Koko rakennuksessa käynnissä olevat työvaiheet:
 - Lukitus- ja heloitusasennukset
 - Varusteasennukset
 - Kaluste- ja laiteasennukset
 - Työmaa-aikaisten sähköjen purku
 - Välioviasennukset
- Koulunmäenkadun muutoksia kevyelle liikenteelle tehty 18.–19.7. Jatkossa jalankulkuväylä kulkee Koulunmäenkadun lävitse. Lisäksi vain työmaakäytössä oleva autoliikenneväylä.

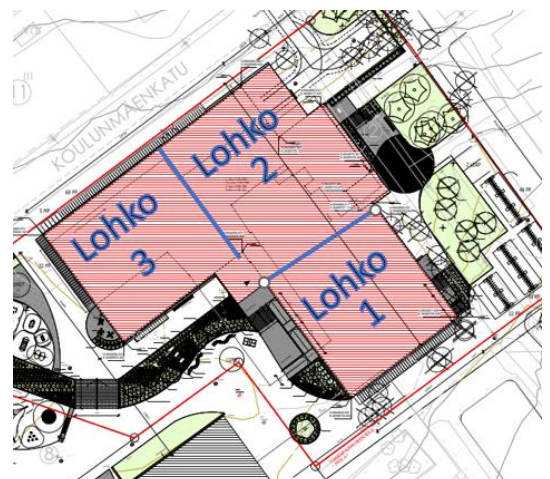


Piha. 25.10.2024

Asfaltointi valmis.
Pihakiveyksiön viimeistelyt
käynnissä. Pihan valaisimet
nostettu pystyyn.



Lohko 2. 25.10.2024

Korkean aulan tasoitekatto
valmis. Valaisimien asennus
käynnissä. Tasoite- ja
maalaustyöt käynnissä.

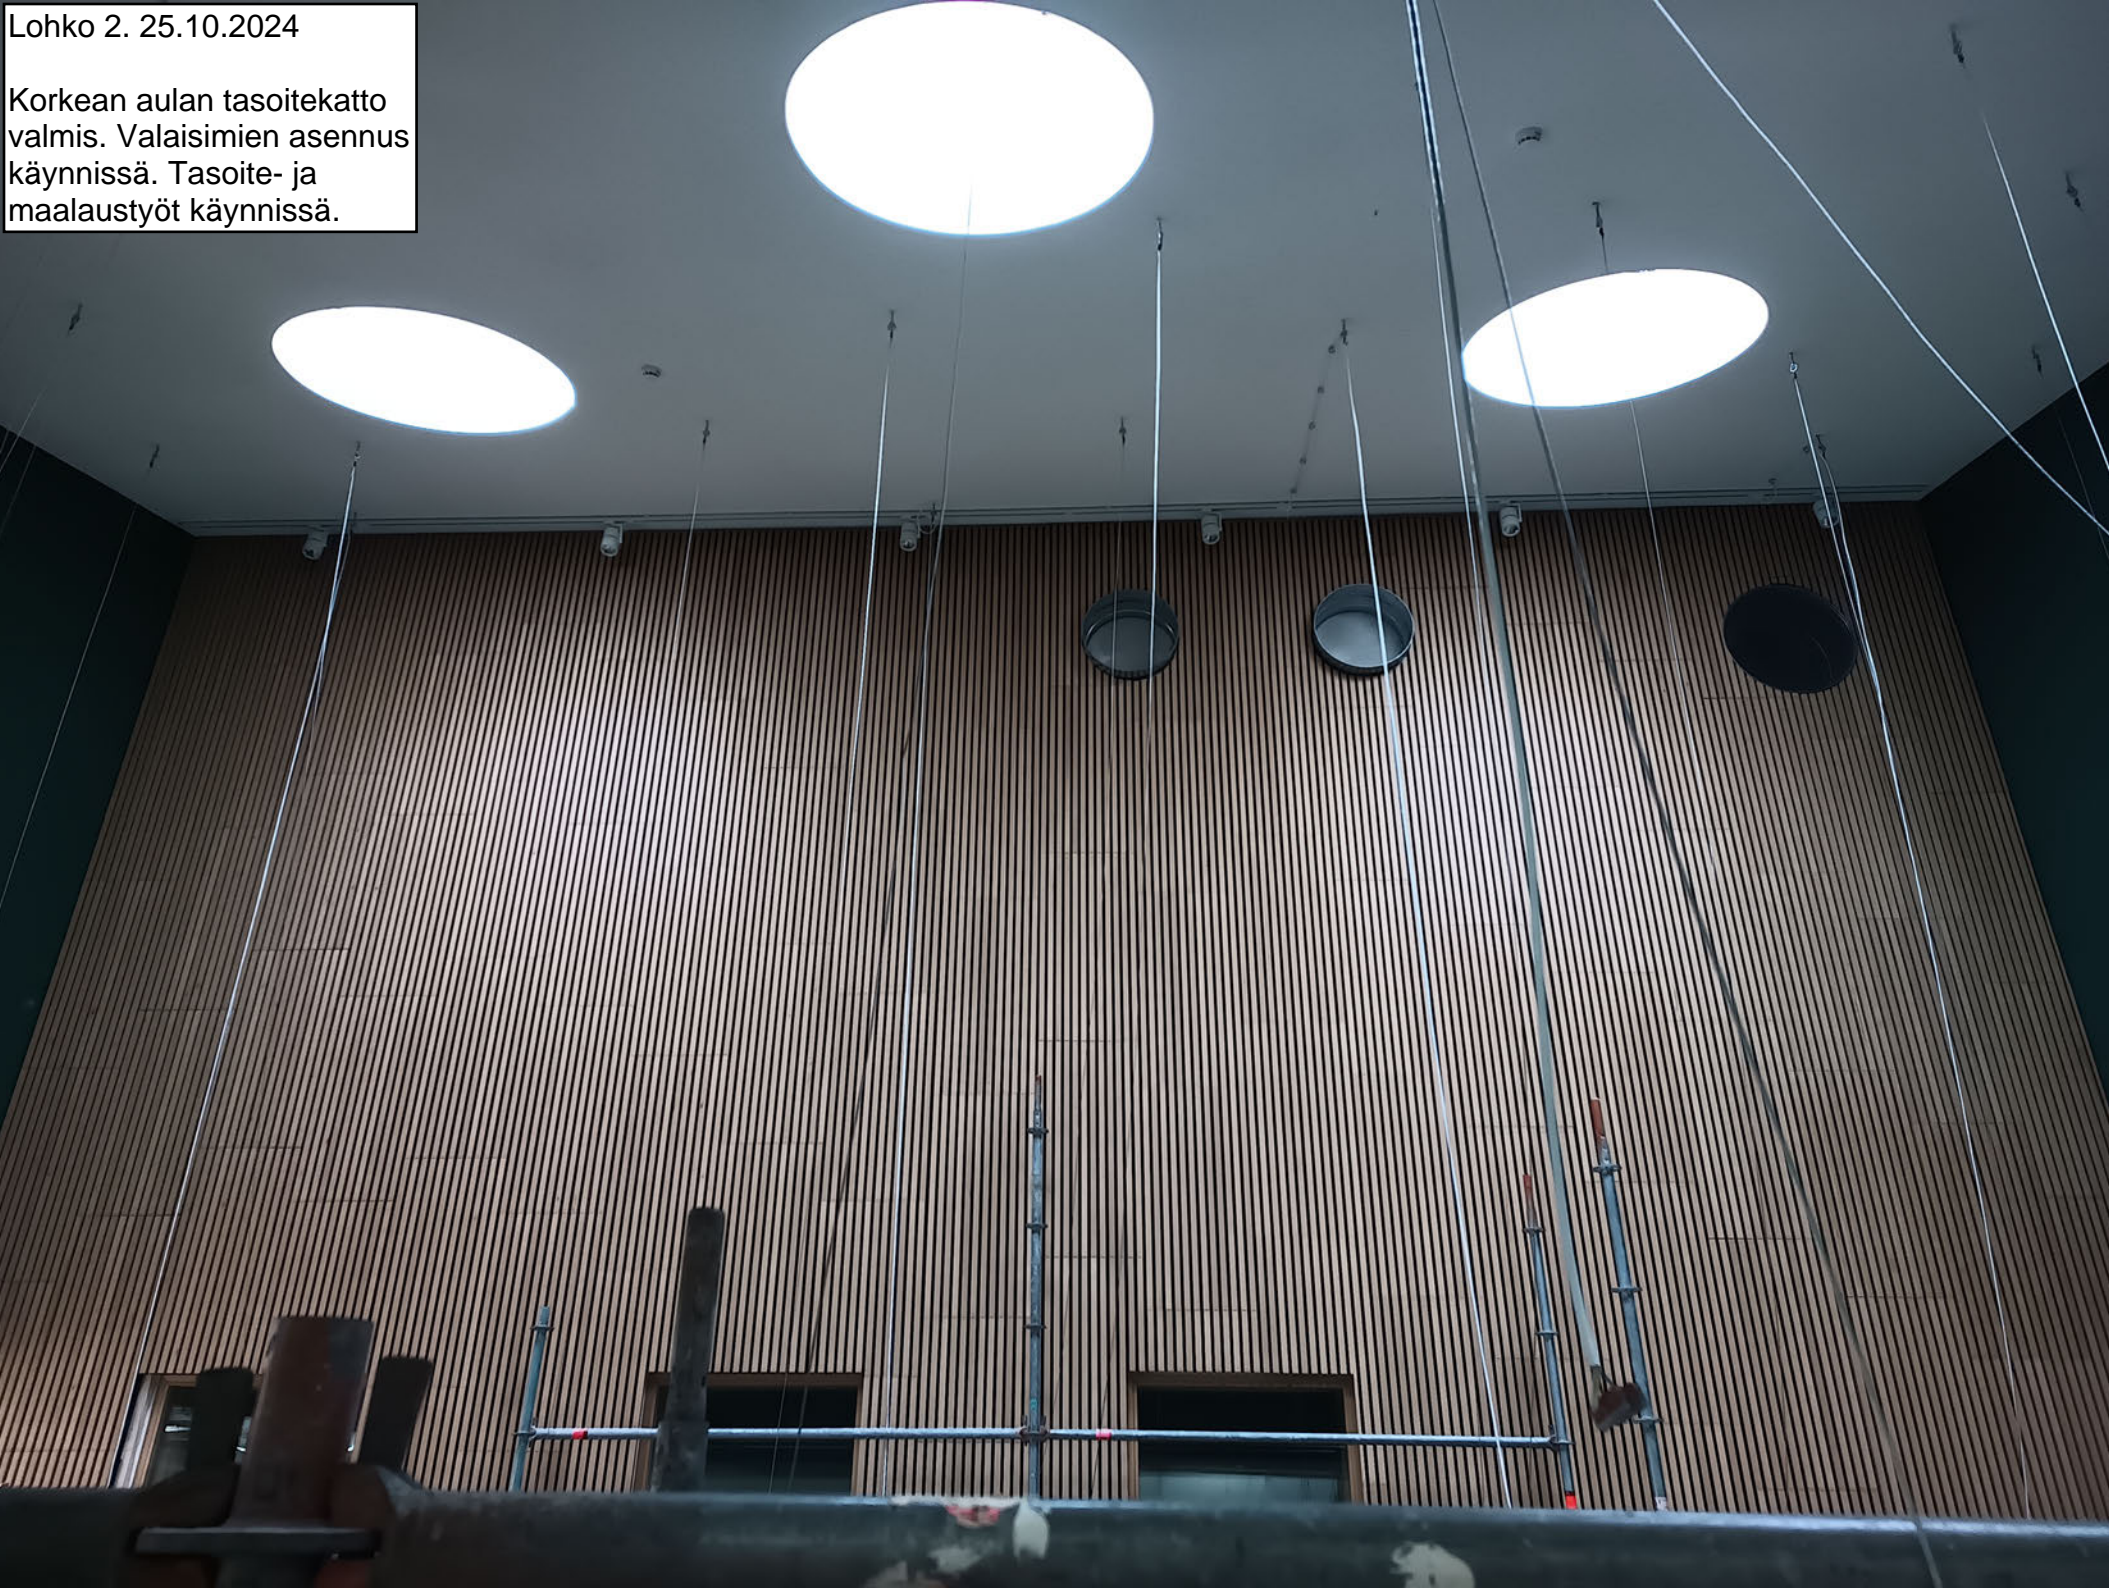

Lohko 2. 25.10.2024

Puuväliovet odottavat ensi viikon asennusta.



Lohko 2. 25.10.2024

Alakattorungot valmiina 2.
kerroksen aulassa.

