

5.12.2024

Koulunmäen yhtenäiskoulu, yläkoulu (C-rakennus)

Projekti 318123

## Viikkotiedote vko 49/2024

### Lohko 1

Meneillään olevat työvaiheet:

- Liikuntasalin joustolattiarakenteet
- 1.krs loput IV-asennukset

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- 1.-2.krs alakattojen ummistus
- 2.krs liukulasiovien asennus

Valmistuneet työvaiheet:

- Sähkö- ja putkityöt
- 1.krs loput mattotyöt
- 1.krs ovi- ja ikkunalistoitustyöt

### Lohko 2

Meneillään olevat työvaiheet:

- IVKH tekniikkalevyjen asennus
- Aulan lasikaideasennukset
- Aulan portaiden puurakenteet
- 1.krs käytävän laatoitustyöt
- 1.krs teknisten tilojen purunpoistokanava-asennus

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- Sisäikkunoiden asennus loppuun

Valmistuneet työvaiheet:

- Sähkö- ja putkityöt
- IVKH putkityöt
- 1.krs loput mattotyöt
- 1.krs aulan väliovien asennus
- 2.krs ovi- ja ikkunalistoitustyöt

### Lohko 3

Meneillään olevat työvaiheet:

- 1.krs IV-päätelaiteasennukset
- 2.krs IV-päätelaiteasennukset

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- 1.krs ovi- ja ikkunalistoitustyöt

Valmistuneet työvaiheet:

- Sähkö- ja putkityöt

### Piha-alue

Meneillään olevat työvaiheet:

- Ylimääräisten tavaroiden poisvienti

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:


- Pihavalaisimet

Valmistuneet työvaiheet:

- 

### Muuta

- Koko rakennuksessa käynnissä olevat työvaiheet (suluissa kokonaisvalmiusprosentti):
  - Lukitus- ja heloitusasennukset (80 %)
  - Varusteasennukset (95 %)
  - Välioviasennukset (90 %)
  - Kenttä- ja keskuslaiteasennukset (70 %)
  - Kaideasennukset (39 %)
  - Toimintakoesiivoukset (20 %)
  
  - Kaluste- ja laiteasennukset (~85 %)
  - Tasoite- ja maalauksen korjauskierrrokset aloitettu (~30 %)
  - IV-päätelaiteasennukset (~50 %)
  - Sähkö- ja putkitöiden mittaukset (~90 %)
- Koulunmäenkadun muutoksia kevyelle liikenteelle tehty 15.11. Betoniaitoja siirretty. Katu avataan muulle liikenteelle helmikuun 2025 aikana.

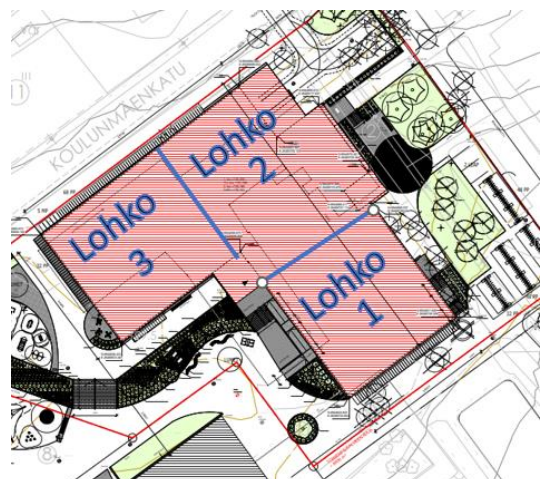

Lohko 3. 5.12.2024

Kerros 2, toimintakoesiivoukset  
alkavat ensi viikolla.




Piha. 5.12.2024

Lastauslaiturialueella purunpoistokontin asennus käynnissä.  
Sisätiloissa sen kanava-  
asennukset käynnissä.



Lohko 1. 5.12.2024

Liikuntasalin joustolattian viimeinen pinta kuivumassa.  
Pelirajamaalaukset tämän viikon aikana.

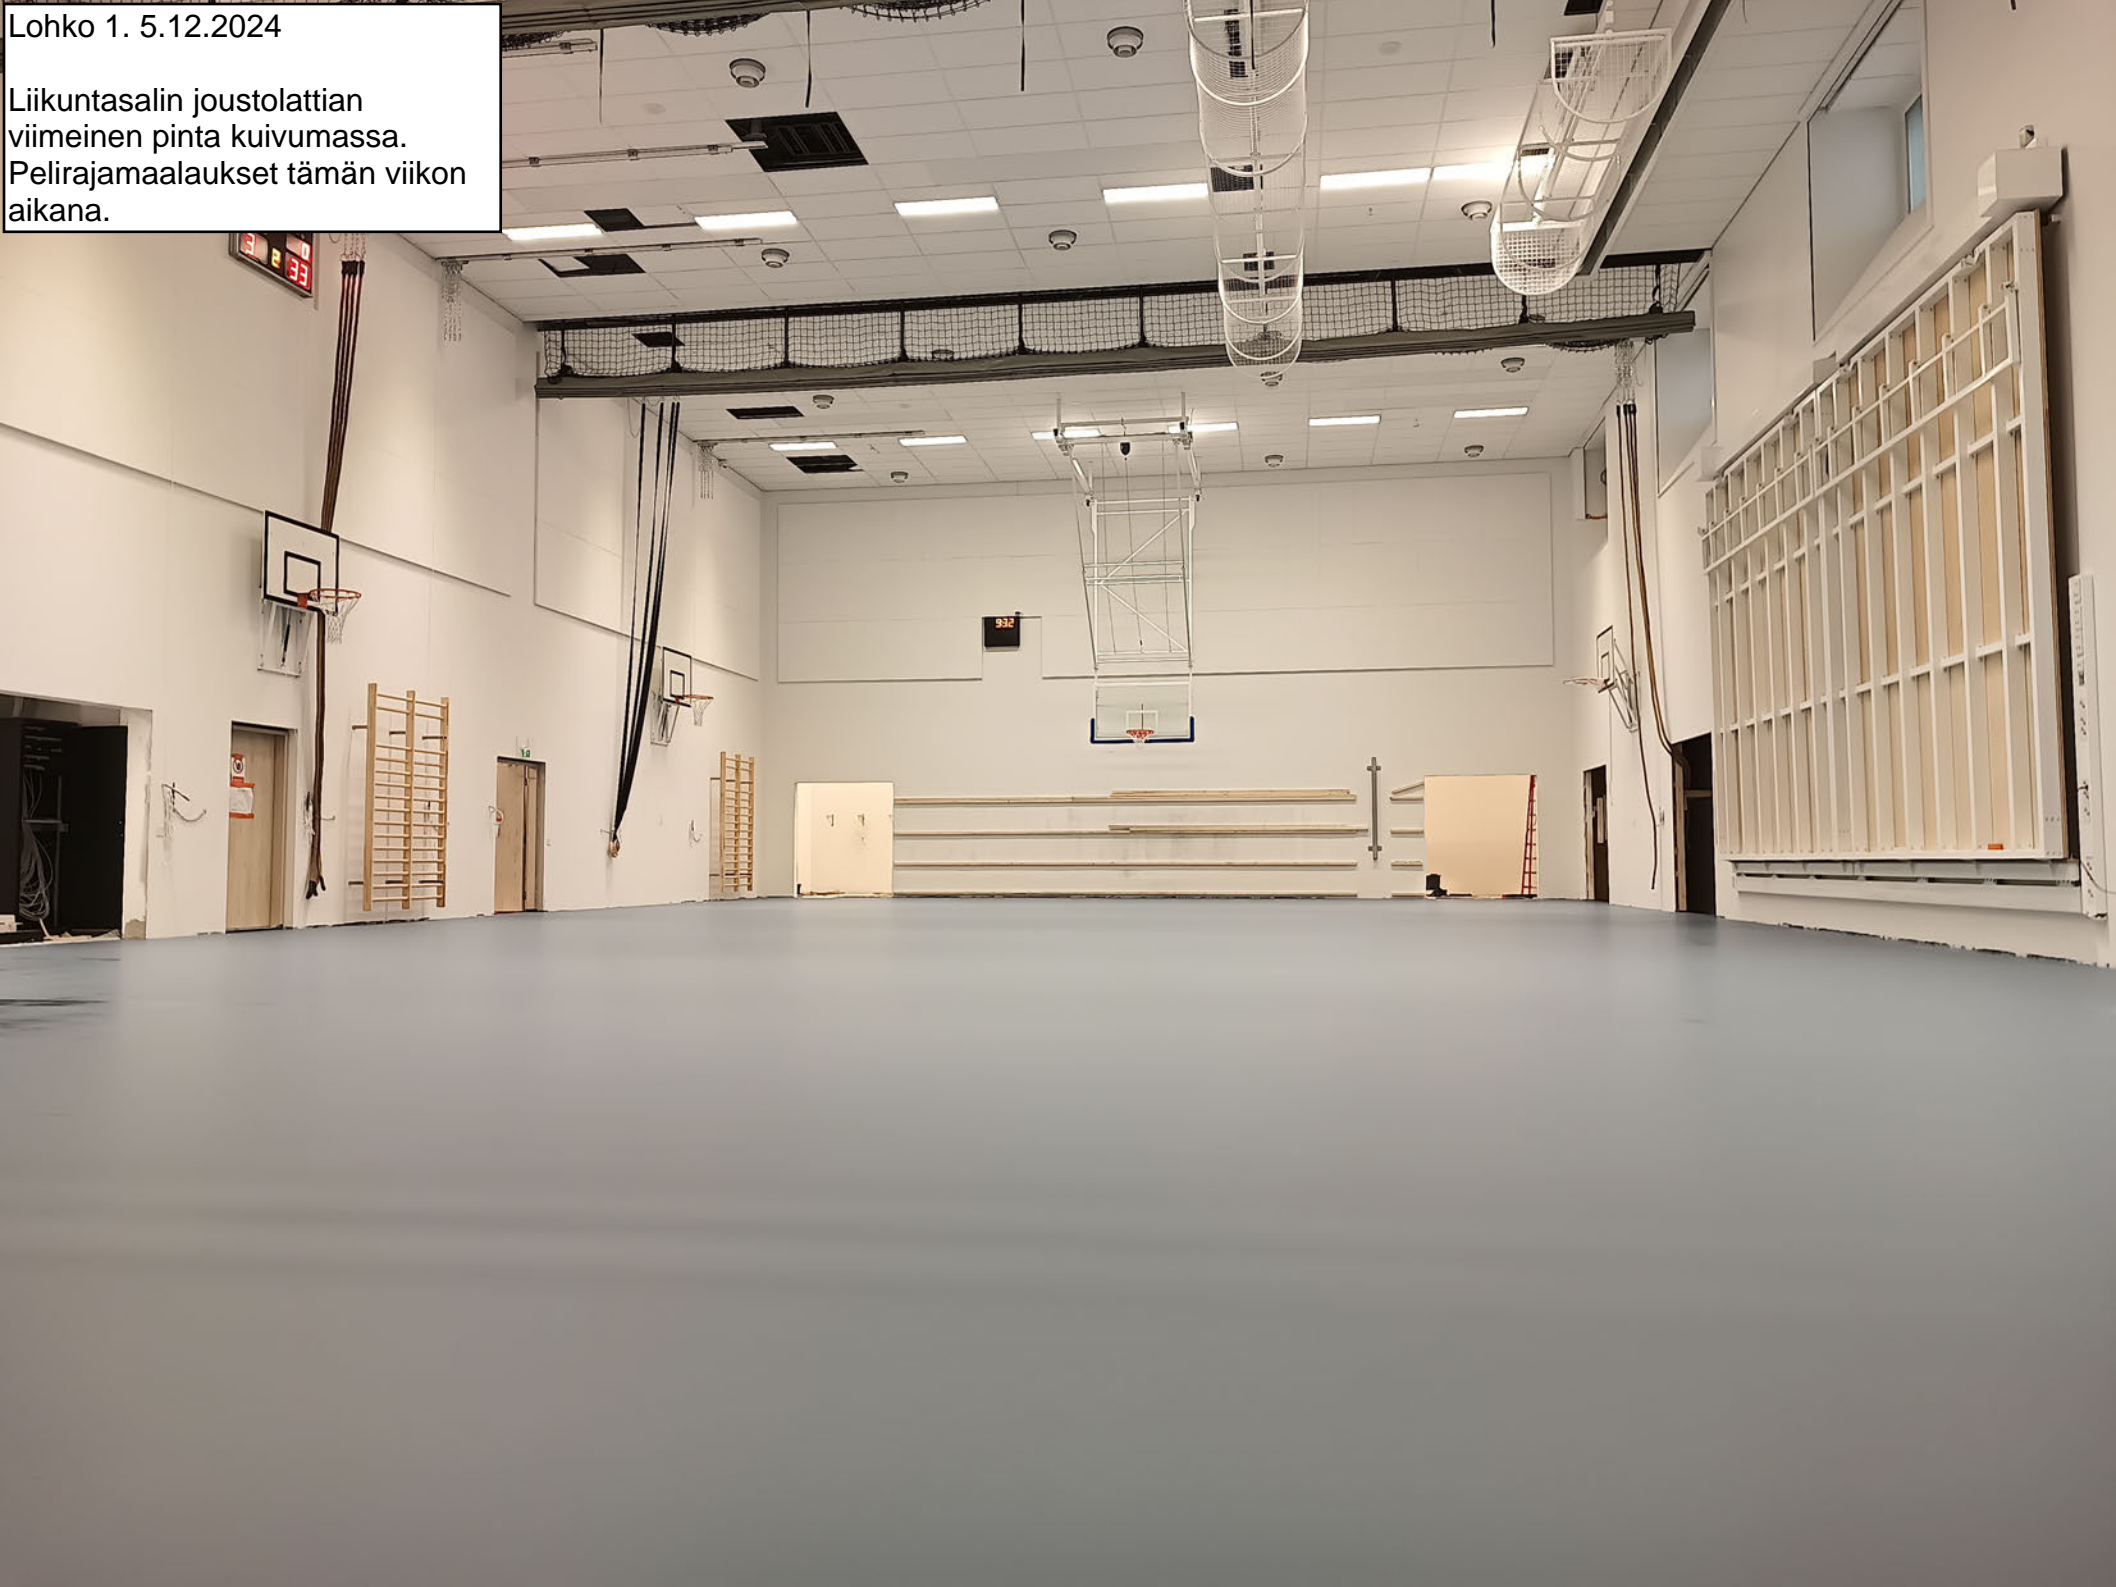

Lohko 2. 5.12.2024

Kerros 2, oppilaslokeroiden ja opinportaiden istuintasojen asennus käynnissä. Ensi viikolla lasikaideasennukset.

