

1.3.2024

Koulunmäen yhtenäiskoulu, yläkoulu (C-rakennus)

Projekti 318123

Viikkotiedote vko 9/2024

Lohko 1

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkötyöt
- Ullakon IV-asennukset ja eristykset
- Talotekniikka reikien poraukset
- 1.krs tasoitus- ja maalaustyöt
- 2.krs kevyet väliseinät
- Liikuntasalin ripustusrakenteet

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- 2.krs sementtiliimojen poistot

Valmistuneet työvaiheet:

- Työmaan vesilinjan asennukset
- 1.krs sementtiliimojen poistot
- 1.krs betonin etuputsityöt
- Vesikaton puutyöt
- Vesikaton pellitystyöt

Lohko 2

Meneillään olevat työvaiheet:

- 1.krs väliseinäasennukset
- 3.krs IVKH lattiaraudoitukset
- Sähkötyöt
- Työmaan vesilinjan asennukset
- Vesikaton puutyöt
- Vesikaton höyrynsulku
- Talotekniikka reikien poraukset
- 1.krs kevyet väliseinät
- Aurinkopaneeliasennukset

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- 2.krs pintalaattojen raudoitustyöt

Valmistuneet työvaiheet:

- 1.krs pölynsidontamaalaus
- 2.krs pölynsidontamaalaus

Lohko 3

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkötyöt
- Työmaan vesilinjan asennukset
- 1.krs lattiasementtiliimojen poistot

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:


- 1.krs alapohjan valu
- Vesikaton puutyöt

Valmistuneet työvaiheet:

- 1.krs alapohjan raudoitustyöt
- 2.krs pintalaatan valu (2/2)
- 2.krs pintalaattojen raudoitustyöt
- Sääsuoja asennukset
- Vesikaton kuorielementtien tukirautojen palosuojaus

Muuta

- Koulunmäenkatu katkaistu liikenteeltä, kulkureitti jalankulkijoille reunassa
- Sääsuoja paikallaan

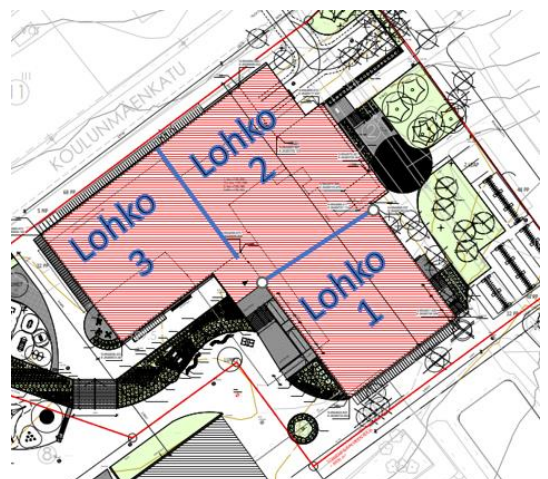

Lohko 3. 1.3.2024

Sääsuoja-asennukset valmistuneet. Puurakennurakka seuraa perästä.



Lohko 3. 1.3.2024

1.krs alapohjan valuvalmistelut tehty. Valu ensi viikolla.



Lohko 2. 1.3.2024

Aula pölynsidontamaalattu
katosta. Talo-tekniikkaurakoitsijat
seuraavat perästä.



Lohko 1. 1.3.2024

Liikuntasali pölynsidontamaalattu.
Teräsrakenteet pääosin
asennettuna ja seinien levytystä
aloitettu.

