

Koulunmäen yhtenäiskoulu, yläkoulu (C-rakennus)

Projekti 318123

## Viikkotiedote vko 25/2024

### Lohko 1

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkö- ja putkityöt

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- 

Valmistuneet työvaiheet:

- 1.krs vesieristys- ja laatoitustyöt

### Lohko 2

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkö- ja putkityöt
- Vesikaton puutyöt
- Vesikaton peltityöt
- Talotekniikkareikien poraukset
- Ullakon IV-asennukset
- IVKH koneasennukset
- IVKH IV-asennukset
- 1.krs tasoitus- ja maalaustyöt
- 2.krs vesieristys- ja laatoitustyöt

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- Huoltokatoksen tasoitus- ja maalaustyöt

Valmistuneet työvaiheet:

- 2.krs tasoitus- ja maalaustyöt

### Lohko 3

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkö- ja putkityöt
- Ullakon IV-asennukset
- 1.krs tasoitus- ja maalaustyöt
- 2.krs IV-asennukset
- 2.krs vesieristys- ja laatoitustyöt

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- 1.krs IV-asennukset

Valmistuneet työvaiheet:

- 

### Piha-alue

Meneillään olevat työvaiheet:

- Maantäytöt rakennuksen ympärillä
- Maakaapeloinnit
- Julkisivun puu- ja levytyöt (uimahallin puoleinen seinusta)
- Ulkokatoksien teräsrakenteiden asennukset

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:


- Sääsuojan purku lohko 2

Valmistuneet työvaiheet:

- 

### Muuta

- Koulunmäenkatu katkaistu liikenteeltä, kulkureitti jalankulkijoille reunassa. Tu-  
lossa muutoksia kevyeen liikenteeseen  
Koulunmäenkadulla ja Mikonraitilla

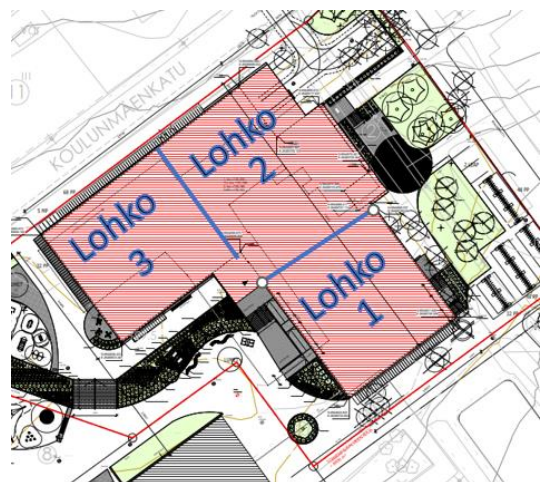

Lohko 3. 20.6.2024

Laatoitustyöt 2.krs etenevät vauhdilla.





Lohko 2. 20.6.2024

Tasointyöt alkaneet 1.krs,  
maalaukset seuraavat perästä.





Lohko 1. 20.6.2024

Ulkokatoksien teräsrakenteiden  
asennukset aloitettu. Puu- ja  
peltityöt seuraavat perästä.





Lohko 2. 20.6.2024

Vesikaton puu- ja peltityöt odottavat ensi viikon sääsuojatelineiden purkua.

