

Äänekosken museon 2. sisävalmistusvaihe

Viikkotiedote

Viikko 10

6.3.2026

Työmaalla käynnissä wc-tilojen lattialaatoitustyöt ja vedeneristykset, sähköasennukset, tekniikkakoteloiden ummistaminen ja muut pienemmät rakennustyöt. Putkimies on myös aloittanut vesikalusteiden asentamisen.




Sähköasennukset aloitettu porrashuoneissa.



Ensimmäisen kerroksen WC-tiloissa on asennettu vesikalusteet. Seuraavaksi loput varusteet ja sähköasennukset.



Laatoitukset valmiit 2. krs WC- ja siivoustiloissa. Seuraavaksi vesikalusteiden asennusta.

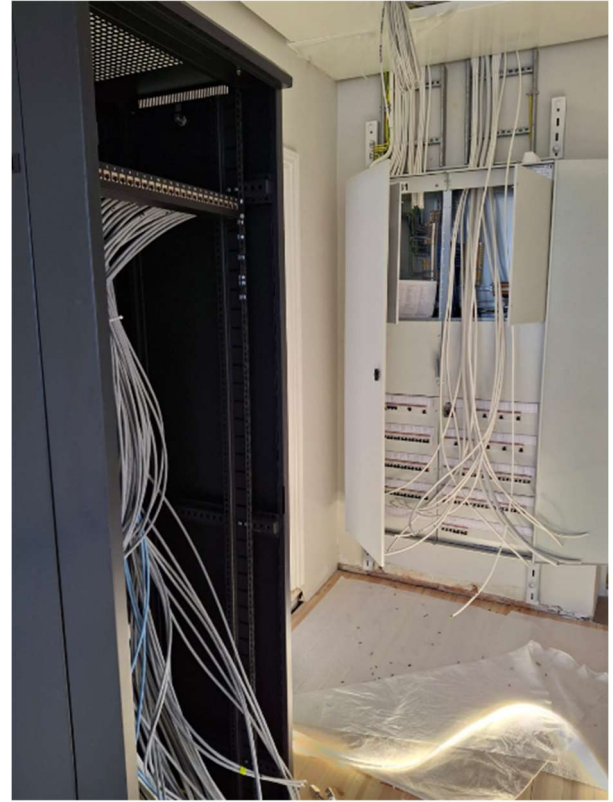

Kaapeleita on vedetty sähkö- ja ATK-keskuksille.



2. kerroksen lyijymosaiikkilasiseinän aukon
koristeet tehty valmiiksi aukon päälle.
Seuraavaksi paikalleenasennus.
