

Äänekosken museon 2. sisävalmistusvaihe

Viikkotiedote


Viikko 11

16.3.2026

Työmaalla käynnissä sähkö-, turva-, LVI- ja jäähdytysasennukset ja lisäksi muut pienemmät rakennustyöt, kuten tekniikkaläpivientien tekeminen, laatoitustöiden viimeistely ja hätäpoistumistieportaan betonianturan rakentaminen.




Turvalaiteasennukset käynnissä työmaalla.

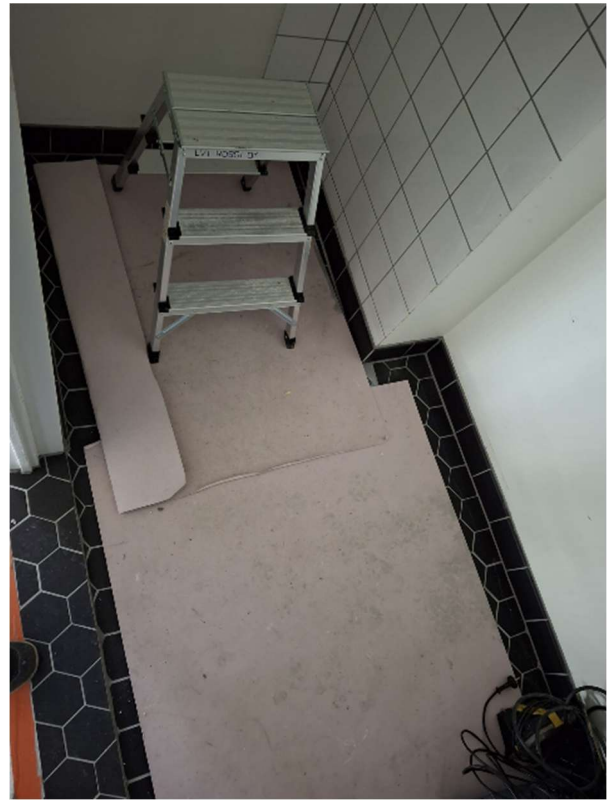

Toisen kerroksen siivoushuoneen lattia on laatoitettu. Tällä hetkellä tilassa käynnissä LVI-asennukset.



Jäähdytyksen sisäyksikkö asennettuna paikalleen ja yläpohjaan tehty läpivientireikä suojaputkea varten valmiiksi. Jäähdytyksen ulkoyksiköt sijoitetaan vesikatolle.

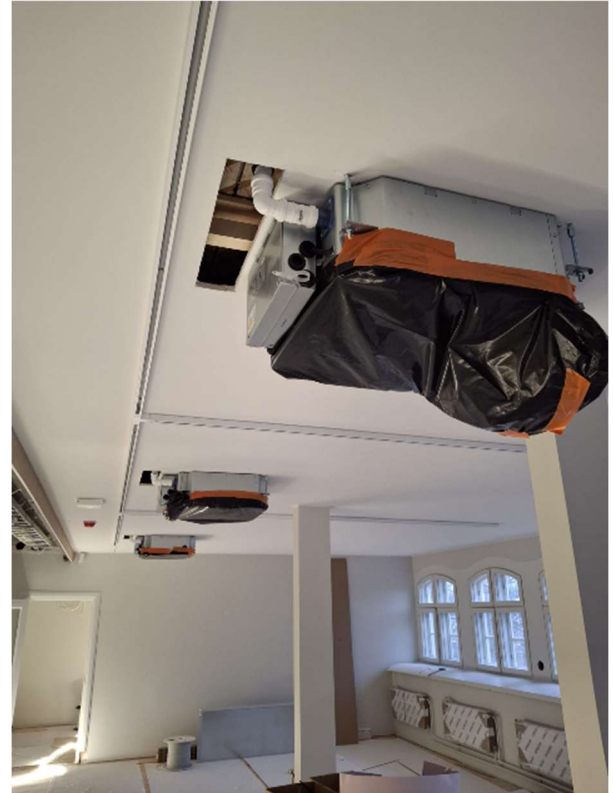

Näyttelytilan kattoon on asennettu jäähdytyksen kattomallin sisäyksiköitä. Kylmäaine- ja tippavesiputket johdetaan alakaton yläpuolella osaltaan vesikatolle ja viemäriin. Seuraavaksi sisäyksiköt koteloidaan kipsilevyllä.



Jäähdytyksen sisäyksikkö paikallaan ensimmäisessä kerroksessa.



Sähköasennukset jatkuvat työmaalla.
