

Äänekosken museon 2. sisävalmistusvaihe

Viikkotiedote

Viikko 15

10.4.2026

Työmaalla käynnissä sähkö-, LVI- ja IV-asennukset sekä rakennustyöt. Tällä viikolla on asenneltu lyijylaseja, putkitettu jäähdytyksen sisä- ja ulkoyksiköitä, asennettu viimeisiä vesikalusteita, aloitettu ilmastointikanavien asennukset ja muut pienemmät rakennustyöt.



Lyijylasit on puhdistettu restauroijan toimesta ja asennettu paikoilleen. Listoitus on vielä kesken ja ennen jalkalistan asennusta lattia on maalattava.



Vanha vene siirretään lattian maalaamisen tieltä. Vene jää tilaan näyttelyesineeksi.




Lyijymosaiikkilasin takapuolelle asennetaan turvalasit. Kuvassa vasemmanpuoleisessa ikkunassa on turvalasi jo paikallaan.



Viimeiset tapetit on asennettu paikoilleen.



Vanhaan porrashuoneen kaiteeseen on asennettu vaakaan lisäkaide. Vanha kaide on liian matala.

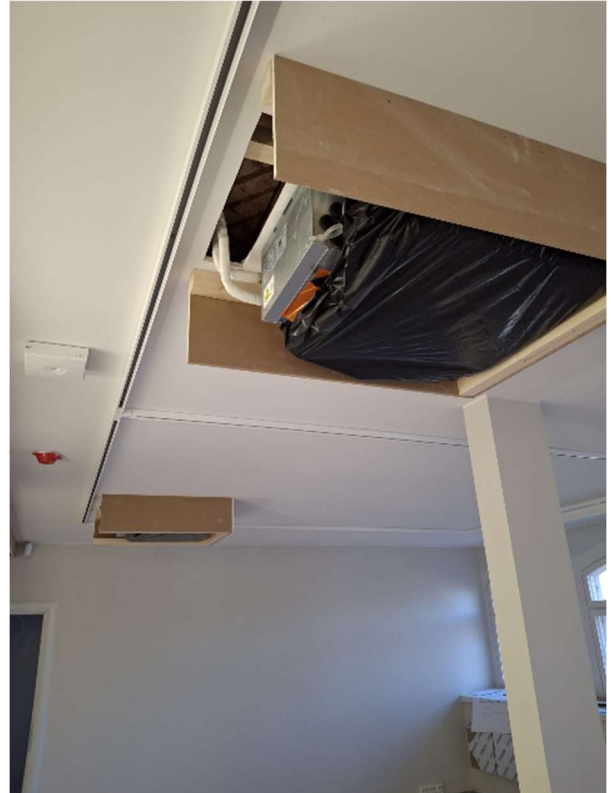

Jäähdytyksen sisäyksiköt koteloidaan piiloon kipsilevyllä. Kotelon alalaitaan tulee jäähdytyslaitteen oma ritilä ja etulaitaan huoltoluukku.



Lisäkaide alapuolelta.



Viimeisiä lautalattioita on maalailtu.
