

Äänekosken museon 2. sisävalmistusvaihe

Viikkotiedote

Viikko 17

24.4.2026

Työmaalla käynnissä sähkö-, LVI- ja IV-asennukset sekä rakennustyöt. Tällä viikolla on asenneltu pääasiassa asenneltu jalkalistoja ja tehty sähköasennuksia. Lisäksi on tehty muita pienempiä rakennustöitä.




Ensiviikolla on tarkoitus asennella varusteita WC- ja siivoustiloihin.



Maalattuihin ikkunapuitteisiin asenneltu takaisin ylälaidan korvausilmaventtiilejä, sälekaihtimen säätötankoja ja uusia messinkisiä ikkunakilpiä.




Työmaalla tehty sähkö- ja turva-asennuksia.  
Kuvassa poistumistien merkkivalo.

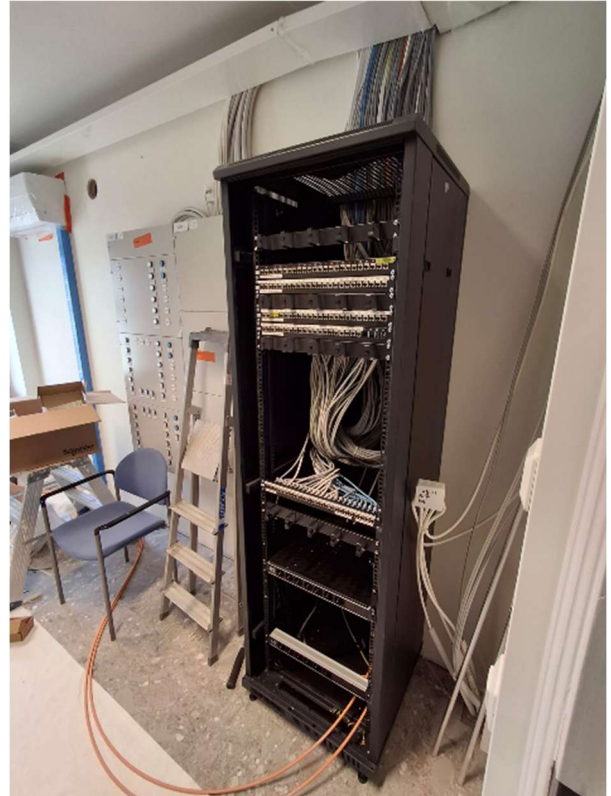

Keskuksella asennukset käynnissä.



2. kerroksen jalkalistoitukset käynnissä. 2. kerroksessa on hieman erilaisen profiilin jalkalistat, kuin 3. ja 1. kerroksissa.

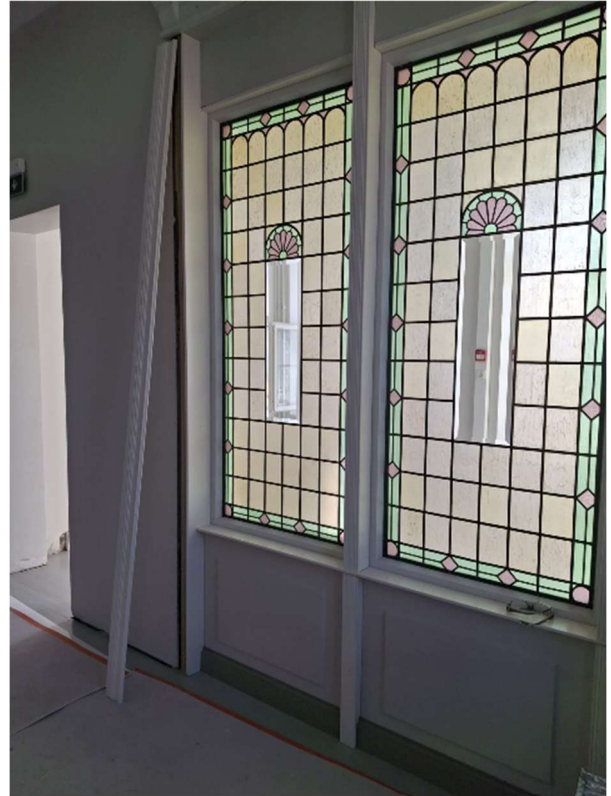

Lyijymosaiikkilasiseinän listoituksen teko loppuun on nyt käynnissä, kun lattia on saatu maalattua.
