

Äänekosken museon 2. sisävalmistusvaihe

Viikkotiedote


Viikko 18

30.4.2026

Työmaalla käynnissä sähkö-, LVI- ja IV-asennukset sekä rakennustyöt. Tällä viikolla on asenneltu parkettia, jalkalistoja, varusteita sekä tehty muita pienempiä rakennustöitä. Sähkö- ja turvalaiteasennukset ovat myös työmaalla käynnissä.




Vetokaappi on toimitettu työmaalle. Seuraavaksi sen siirtäminen paikalleen ja kytkeminen käyttöön.

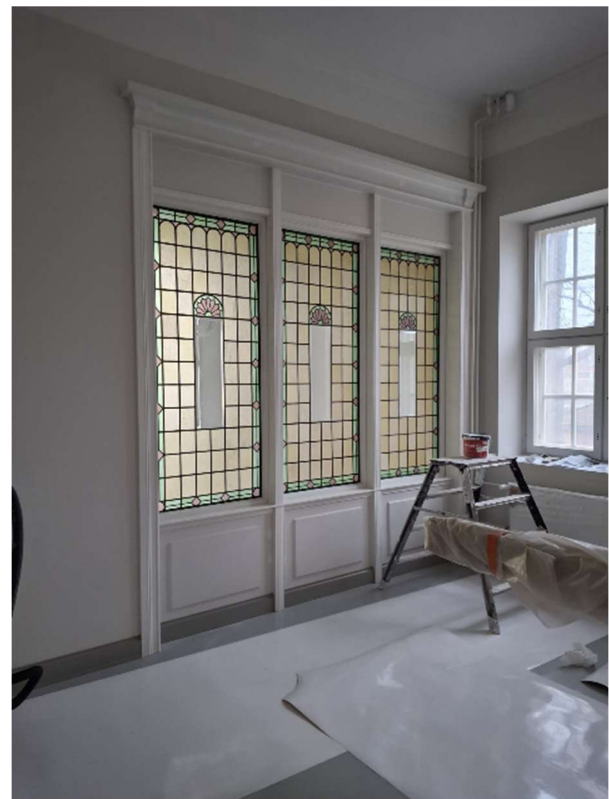

Lasimosaiikkiseinälistoitukset on tehty valmiiksi 2. kerroksessa. Enää pintamaalaus listoituksiin yläpuolen puitteeseen puuttuu.



2. kerroksessa jalkalistan asennus tulee tällä viikolla pääosin valmiiksi.

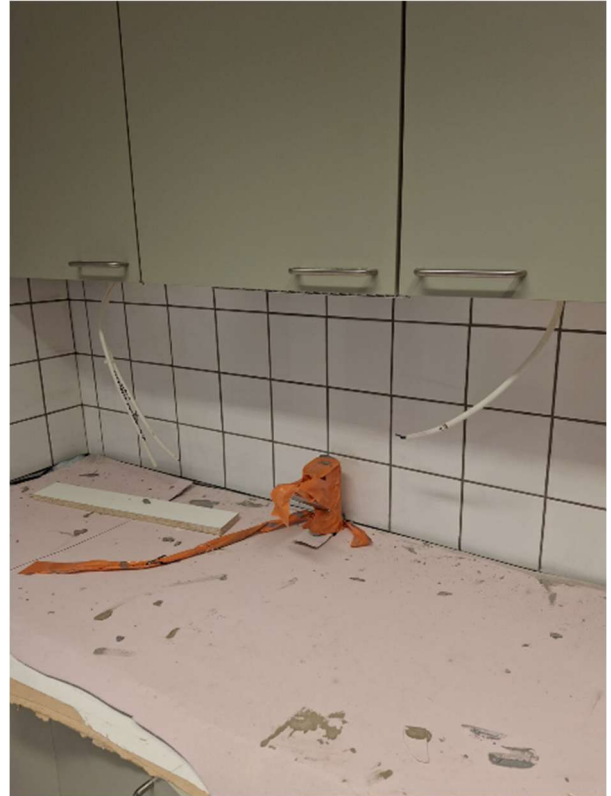

Kalustevälejä on vedeneristetty ja laatoitettu.



Tarkastusluukkuja on asennettu tekniikkakoteloihin ja alakattoihin.



WC- ja siivoustiloihin on asennettu peilit ja osa varusteista. Paperiannostelijat, yms. asennetaan myöhemmin.
