

Äänekosken museon 2. sisävalmistusvaihe

Viikkotiedote


Viikko 8

20.2.2026

Työmaalla käynnissä wc-tilojen lattialaatoitustyöt ja vedeneristykset, sähköjohtoreittien rakentaminen, tekniikkakoteloiden ummistaminen ja muut pienemmät rakennustyöt.




Vanhat konservoidut lasimosaiikkiruudut asennetaan takaisin, sitä varten rakenteilla uusi seinärunko, johon ruudut myöhemmin asennetaan.

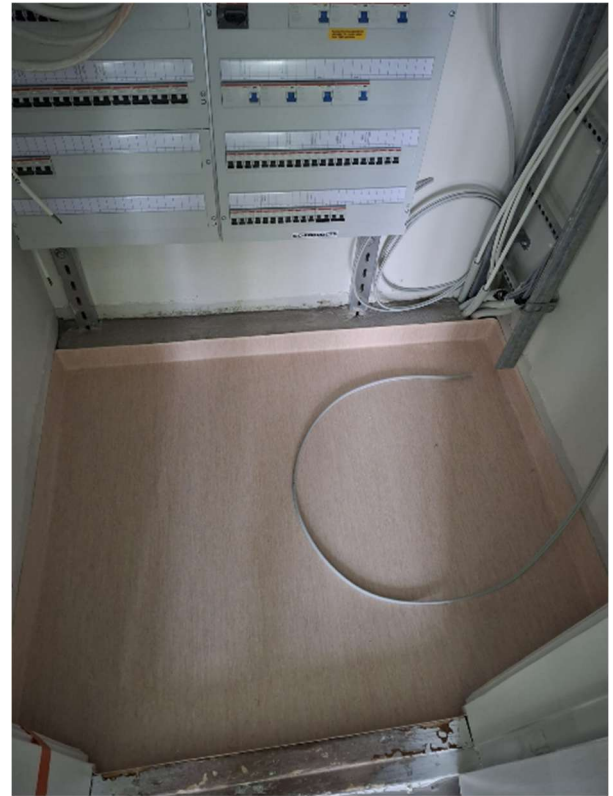

Sähkötilaan asennettu lattiamatto.




Tekniikkakotelot on rakennettu kipsilevystä, seuraavana tasoitukset ja maalaukset. Kyseisessä kotelossa kulkee vesiputkia ja ylemmän kerroksen wc-tilan viemäri.

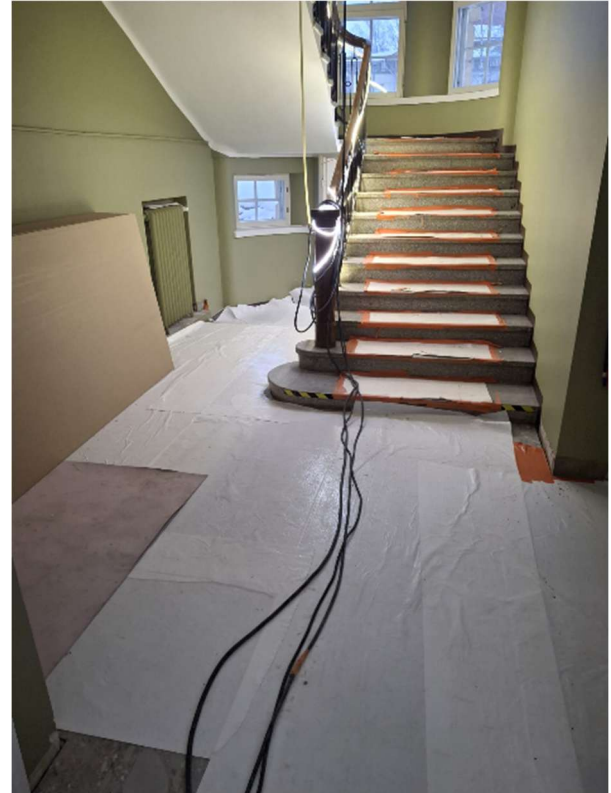

Aulan ja porrashuoneen isot 600 x 600 mm lattialaatat on asennettu, saumattu ja suojattu



Kaapelien vetäminen on käynnissä.

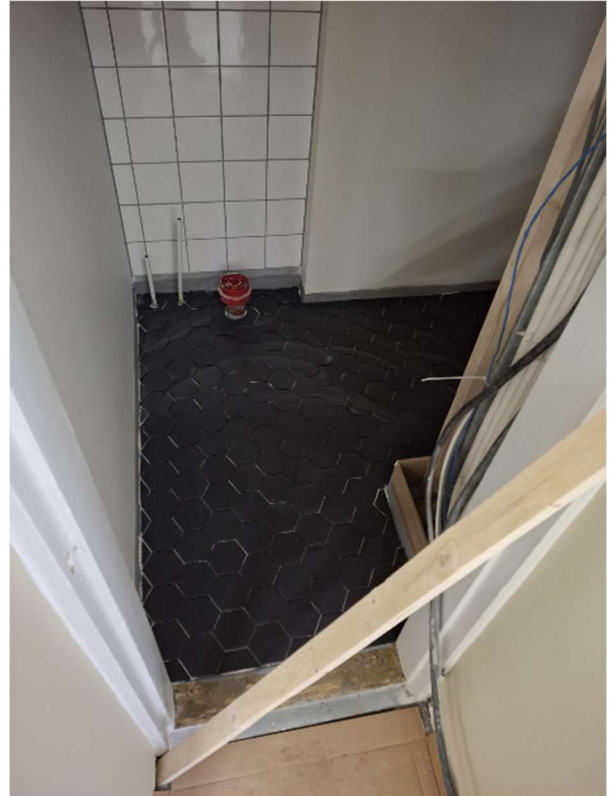

Wc- ja siivoushuonetilojen lattialaatoitukset ovat käynnissä 1. kerroksessa.
