

Äänekosken museon 2. sisävalmistusvaihe

Viikkotiedote


Viikko 9

27.2.2026

Työmaalla käynnissä wc-tilojen lattialaatoitustyöt ja vedeneristykset, sähköasennukset, tekniikkakoteloiden ummistaminen ja muut pienemmät rakennustyöt. Hiihtolomaviikon vuoksi työmaalla hieman tavallista vähemmän toimintaa.



Eteisaulan kipsilevystä rakennettujen koteloiden otsia on pintakäsitelty. Seuraavaksi asennetaan kattofriisi katon ja otsan rajaan. Kotelot jätetään vielä alapuolelta aukinaisiksi ja ummistetaan myöhemmin, sillä niiden sisään tehdään vielä sähköasennuksia.

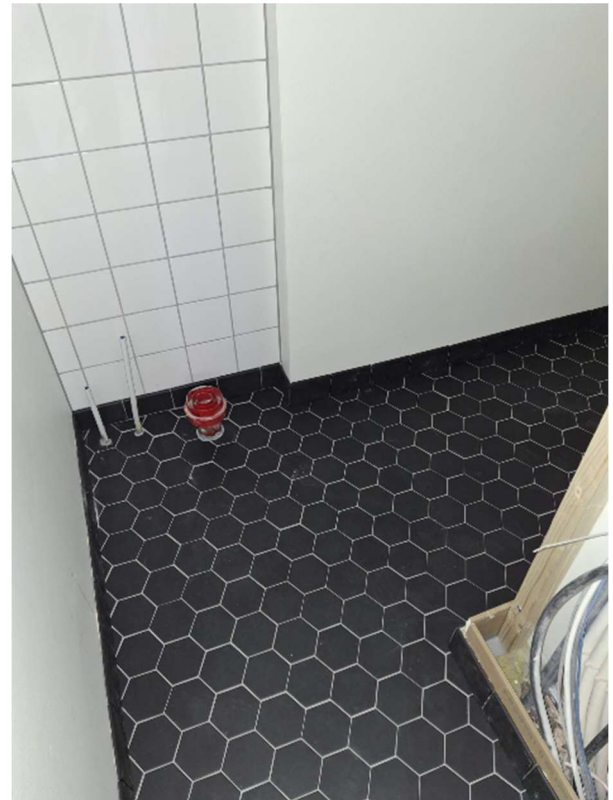

Ensimmäisen kerroksen lattialaatoitukset ovat valmiit WC- ja siivoustilojen osalta. Seuraavaksi putkimies pääsee tiloihin asentamaan vesikalusteita.



Kaapelin veto on työmaalla käynnissä.



Lämmitysputkia on eristetty koteloissa.
Koteloiden ummistus ja pintakäsittely jatkuu.



Hissin seutu on lähes viimeistelty 2. kerroksessa.
